

PROYECTO DE :

**ELIMINACIÓN DE MIL BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS (14ª FASE). LA VIÑA**

MEMORIA DESCRIPTIVA

Por encargo de D. Francisco José García García, Concejal-Delegado de Urbanismo, el Aparejador Municipal D. Luis Martínez Reche, y la Ingeniero Técnico de Obras Públicas Dª Elena Jiménez Baquero, redactan el siguiente Proyecto.

*Como se trata de un trabajo de **ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS**, y queremos que sea muy “accesible”, estableceremos unas dimensiones de letras superiores a lo normal.*

1.- ANTECEDENTES

Se relata a continuación una cronología de los antecedentes administrativos que dan origen a éste trabajo.

En el Boletín Oficial de la Región de Murcia aparece la “Orden 17 de enero de 2003, de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones a corporaciones locales para la redacción del Plan de Accesibilidad Municipal”.

El Director General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, informa al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Lorca en escrito de fecha 14 de mayo de 2003, de una subvención de 34.657,84.- € para la redacción del Plan de Accesibilidad.

El Consejo de Gerencia del día 23 de julio de 2003, le adjudica mediante el sistema de concurso por procedimiento abierto a la empresa FUNDOSA ACCESIBILIDAD, S.A., el contrato relativo a “REDACCIÓN DEL PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL DE LORCA”, en el precio de 41.589.- € (IVA incluido).

El Plan Municipal de Accesibilidad se aprueba en el Consejo de Gerencia de Urbanismo el día 3 de febrero de 2004.

2.- OBJETO

El motivo del Proyecto redactado en el conjunto de este documento, es poner en práctica las recomendaciones, instrucciones y demás detalles recogidos en el Plan de Accesibilidad Municipal, destinados a la eliminación de barreras arquitectónicas en el municipio de Lorca. El objetivo ambiciona a nivel teórico eliminar “**mil barreras**”.

Esta **decimocuarta** fase se centra en acondicionar pasos de peatones, rampas, conexión entre aceras, etc. de acuerdo a Normas, a lo largo de distintas calles del Barrio de La Viña. En concreto, por el Norte limita con la calle Diego Pallarés. Por el Oeste con la Rambla de Las Señoritas. Por el Sur con el Camino Viejo del Puerto. Y por el este con la Rambla de Las Palomas. La superficie aproximada de actuación es sobre un polígono de unas 16 hectáreas. En total se han recogido cuarenta y tantas fichas con las consiguientes fotos ilustrativas del estado actual, incorporando en la misma ficha la solución propuesta, avalada por la medición y el presupuesto.

En función de la experiencia resultante de este trabajo, se ampliarán sucesivamente a las zonas donde existen barreras, alternándolas con otras referidas a edificios públicos, señalización y transporte.

3.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS


CONDICIONES GENERALES

01.- Se trata de “obras completas”, terminadas. Incluye el levantado de tapas, recercado a sardinel en las mismas, reposición o reparación de fachadas si resultan dañadas como consecuencia del rebaje en las aceras.....

02.- El bordillo será del tipo C-5

03.- En las aceras se colocará ***adoquín cerámico rojo de 20x10x5 cms***, recibido sobre “cama” de gravilla de 3 a 5 cms de espesor, en el sistema conocido como “pavimento flexible”, que a su vez irá sobre una solera de hormigón de 10-12 cms de espesor HM-20N/mm².

El adoquín cumplirá las siguientes condiciones:

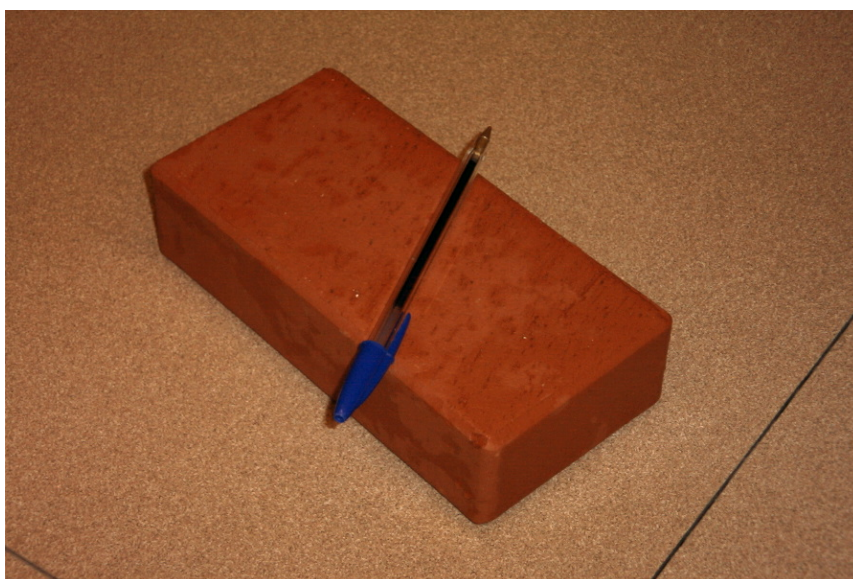

Dimensiones: 198x98x50 mms
Absorción de agua < 6 %
Densidad aparente 2,10
Resistencia al hielo: no heladizo
Resistencia a la abrasión 310 mm³
Resistencia a la flexión DIN 15,3 N/mm²
Resistencia a la flexión (Norma Europea) 135 N/mm²
Resistencia a la compresión 95 N/mm²
Dureza Mohs 7

NOTAS:

- 01.- Las fotos se han realizado durante el mes de marzo de 2006.
02.- Los números que aparecen en las fichas como “título” (ejemplo: 0001), están relacionadas con la misma numeración en el estado de Mediciones.

06. - PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA

Las obras comenzarán, como máximo, antes de los 30 días contados a partir de la firma del Contrato. Extendiéndose entonces el Acta de Comprobación de Replanteo. Debiendo finalizar **SEIS MESES** después de la citada Acta.

07.- OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES DEL CONTRATISTA

El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y Seguridad e Higiene en el Trabajo.

El Contratista deberá constituir el órgano necesario con la función específica de velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, y a tal fin, designarán al personal técnico de seguridad que asuma las obligaciones correspondientes en cada centro de trabajo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él no implicará responsabilidad alguna para la Dirección Técnica en razón de la referida imposibilidad física de presencia continua en la obra.

CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:

Categoría: C

Grupo: C

Subgrupo: 6

08.- CONTROL DE CALIDAD

En razón de la determinación de las calidades de los materiales empleados y su correcta puesta en obra, la Dirección Facultativa decidirá las pruebas y ensayos de materiales que considere oportuno, en aquél laboratorio por ella elegido. El pago del presente concepto será satisfecho por la empresa adjudicataria de las obras hasta el límite del 2 % del Presupuesto de Ejecución por Contrata, el mismo estará incluido en el capítulo de costes indirectos y en el gastos generales.

09.- ESTUDIO GEOTECNICO

Por tratarse de obras superficiales de Albañilería, carentes de otras relacionadas con cimentaciones, ó estructuras, este Proyecto NO necesita estudio geotécnico.



10.- PRESUPUESTO

Asciende el PRESUPUESTO DE CONTRATA a la cantidad de **CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS (165.369,83.- €).**


Lorca, febrero de 2008

Fdo. Elena Jiménez Baquero
Ing. Técnico O. Públicas



Fdo. Luis Martínez Reche
Aparejador Municipal

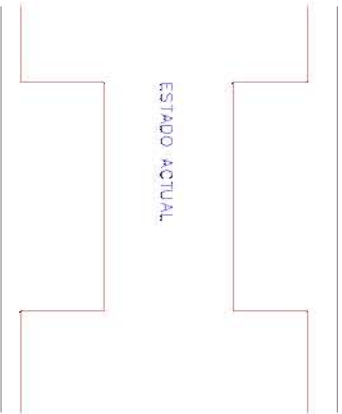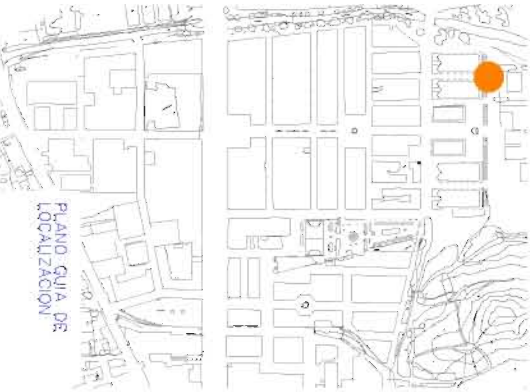


COLEGIO PEREZ DE HITA

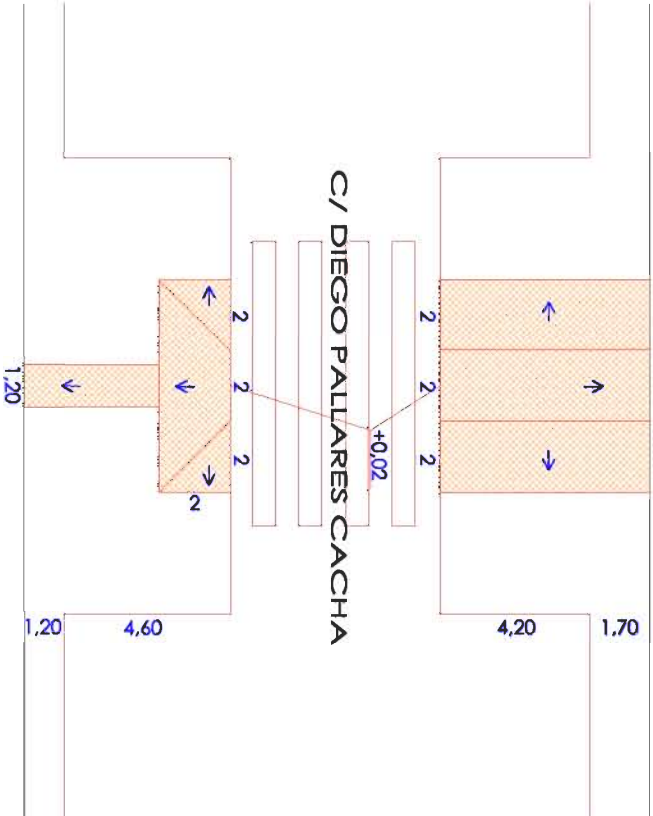


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO AVANZAMIENTO DE LOMCA SERVIDOS TECNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINã	(14º FASE)
	TITULO: 275	SITUACION: C/ DIEGO PALLARES CACHA	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO FECHA: FEBRERO-08

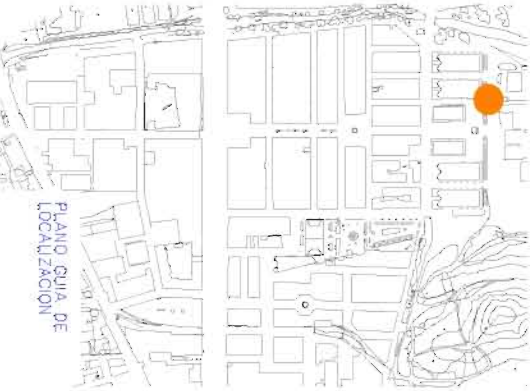

C/ DIEGO PALLARES CACHA

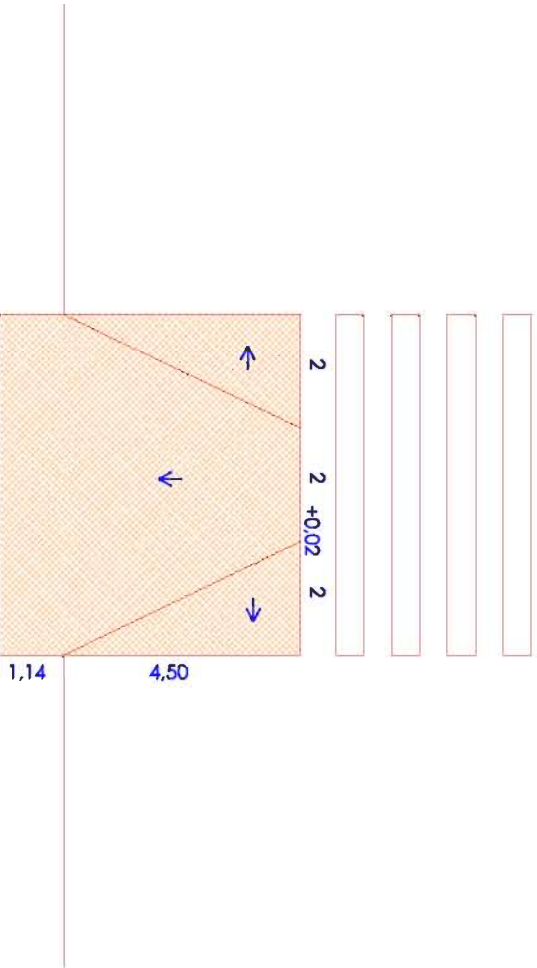

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO AVANZAMIENTO DE LOMCA SERVIDOS TECNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINã	(14º FASE)
	TITULO: 276	SITUACION: C/ DIEGO PALLARES CACHA	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO FECHA: FEBRERO-08

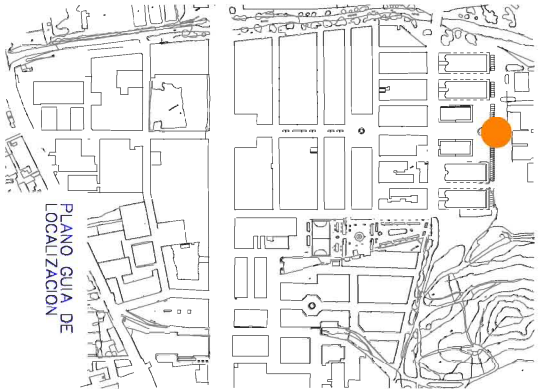


PLANO GUIA DE LOCALIZACION



0277 Colegio E. E. Pilar Soubrier




0277 Colegio Pilar Soubrier (2)

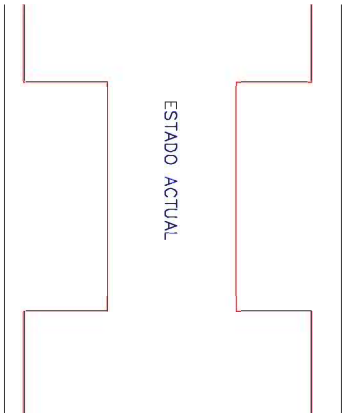


ESTADO ACTUAL

COL. E.E. PILAR SOUBRIER

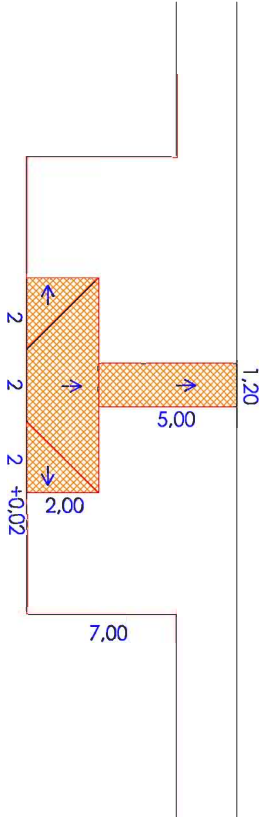

C/ DIEGO PALLARES CACHA

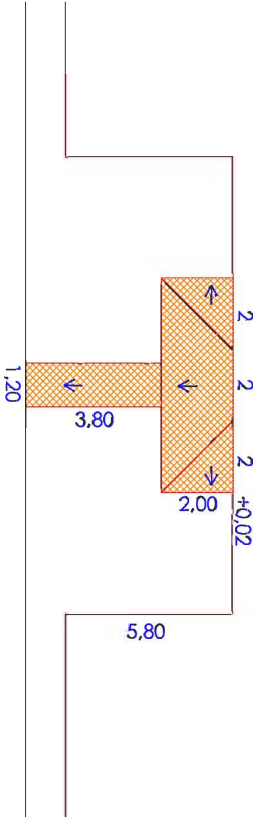


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DIRECCION DE ASESORIA TECNICA SERVICIOS TECNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	(14º FASE)
TITULO: 277	SITUACION: COLEGIO PILAR SOUBRIER	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08



PLANO GUIA DE LOCALIZACION




0278 Calle Diego Pallarés (frente INEM) -2

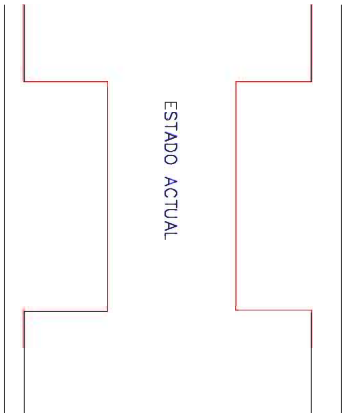


ESTADO ACTUAL


I.N.E.M.-

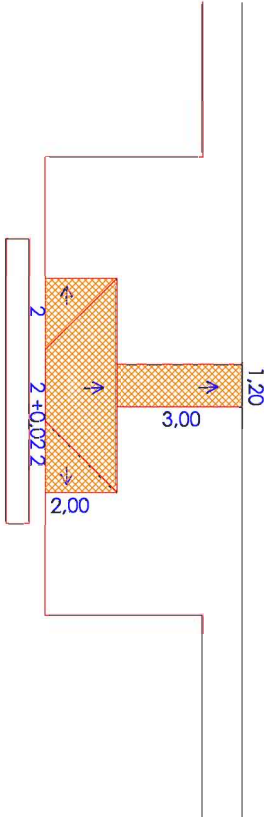

C/ DIEGO PALLARES CACHA

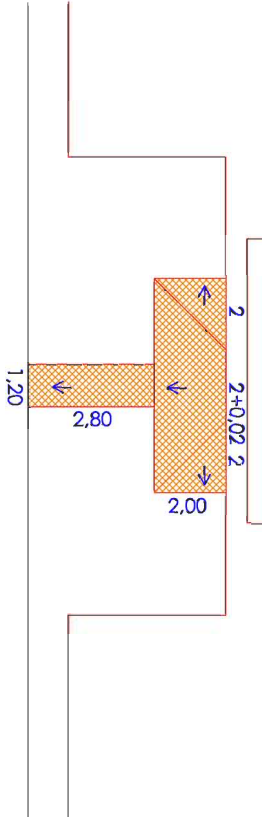


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO DIRECCION DE ASESORIA TECNICA SERVICIOS TECNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	(14º FASE)
TITULO: 278	SITUACION: FRENTE INEM	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08

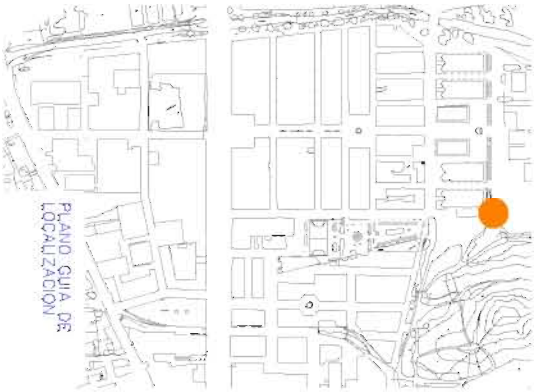


PLANO GUIA DE LOCALIZACION




0279 Diego Pallarés con Tintoreros



ESTADO ACTUAL

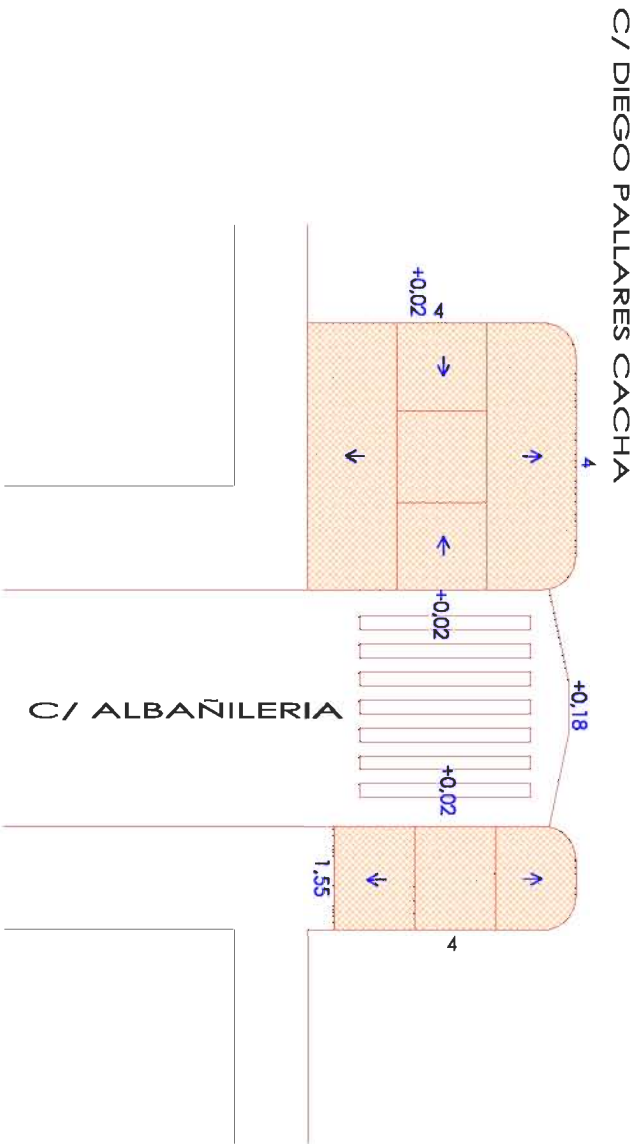

 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO, AVANZAMIENTO DE LOMERA SERVICIOS TECNICOS	TITULO: 279	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA		(14º FASE)
	SITUACION: C/DIEGO PALLARES CON C/.ALBAÑILERIA	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO		
		FECHA: FEBRERO-08		

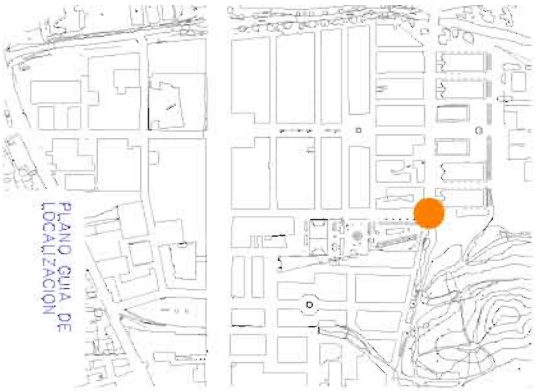


PLANO GUIA DE LOCALIZACION




0280 Calle Tintoreros con Alfarena




0280 Calle Tintoreros entrada al parque

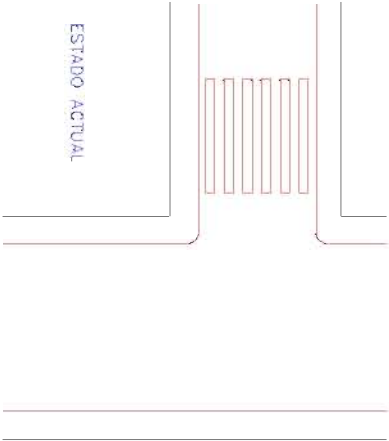

ESTADO ACTUAL

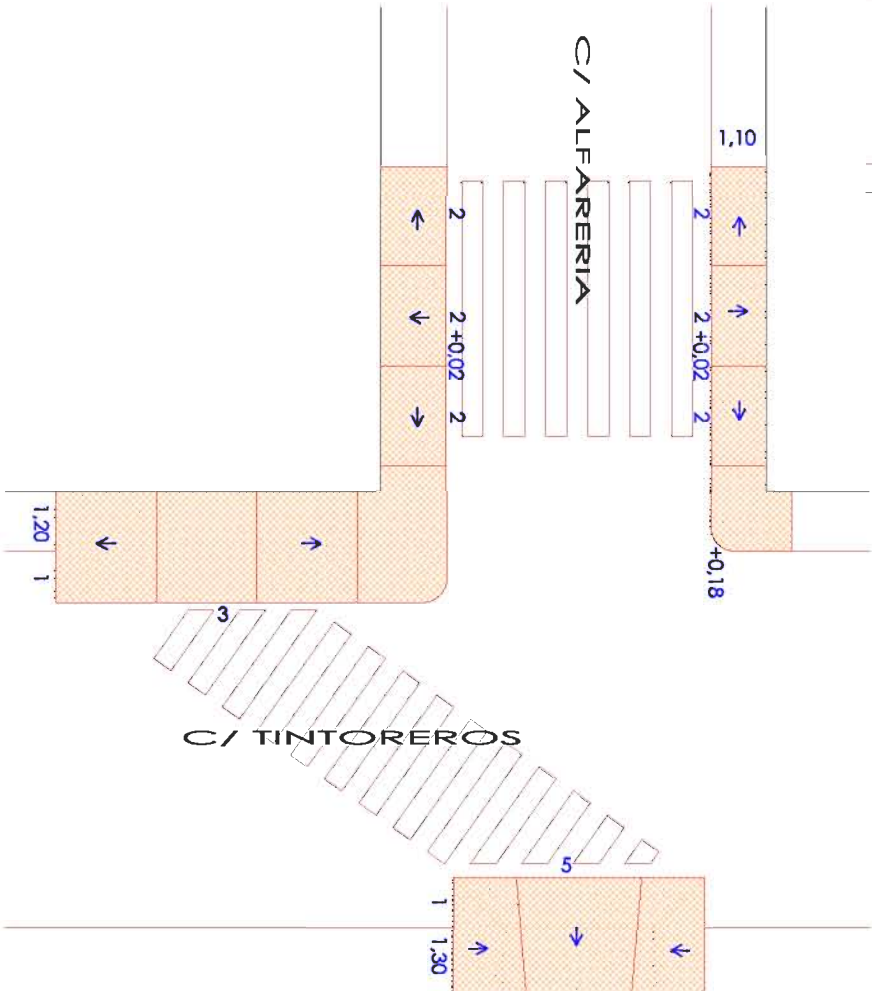


 GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO, AVANZAMIENTO DE LOMERA SERVICIOS TECNICOS	TITULO: 280	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	(14º FASE)
	SITUACION: C / ALFARERIA CON C/ TINTOREROS	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08

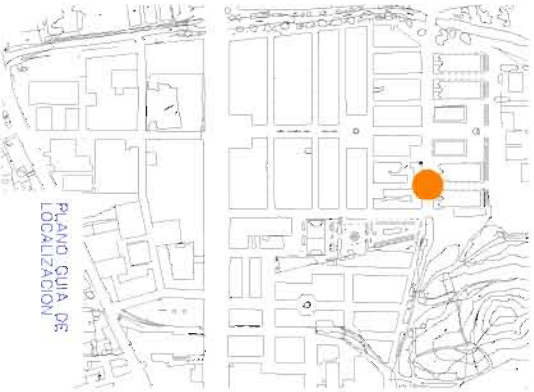


PLANO GUIA DE LOCALIZACION



0281 Calle Modisteria con Alfareria




ESTADO ACTUAL

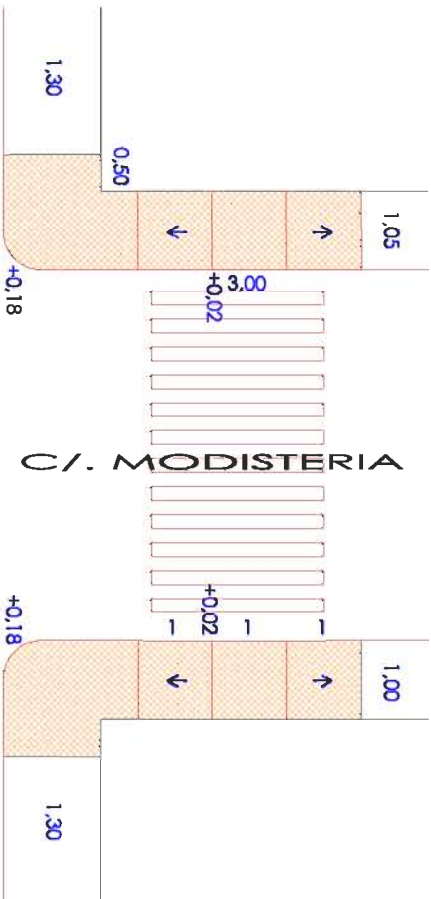

C/ ALFARERIA


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO AVANZAMIENTO DE OBRA SERVICIOS TECNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA		(14º FASE)	
	TITULO: 281	SITUACION: C/. MODISTERIA CON C/. ALFARERIA	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08	

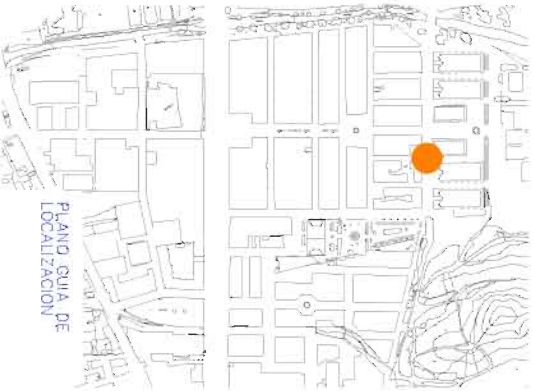


PLANO GUIA DE LOCALIZACION



0282 Calle Sastreria con Alfareria





ESTADO ACTUAL

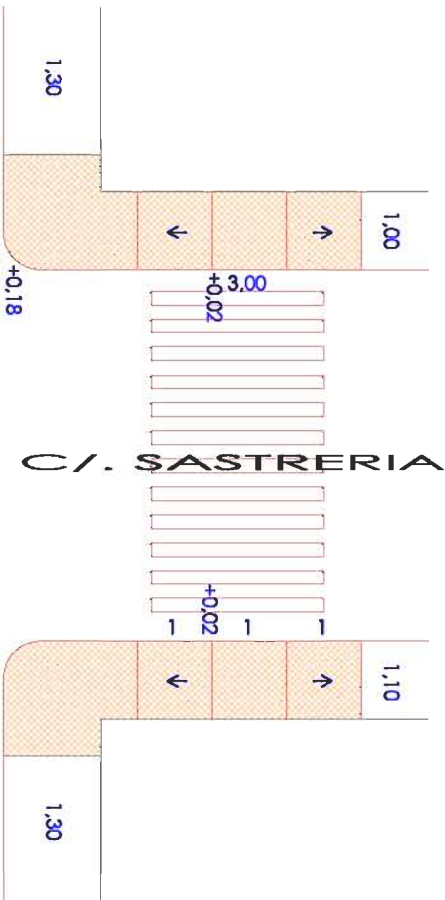


C/ ALFARERIA


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO AVANZAMIENTO DE OBRA SERVICIOS TECNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA		(14º FASE)	
	TITULO: 282	SITUACION: C/ ALFARERIA CON C/. SASTRERIA	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08	

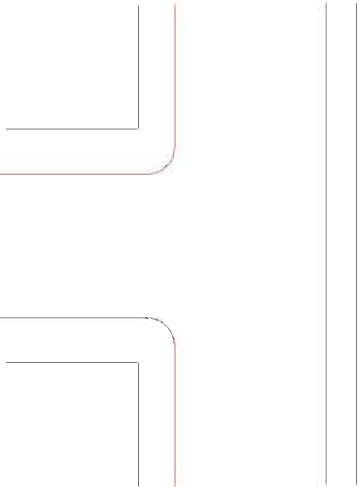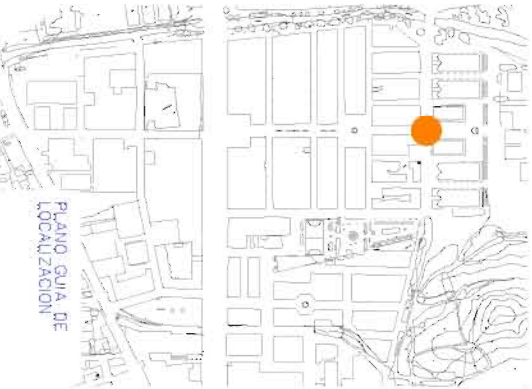


ESTADO ACTUAL

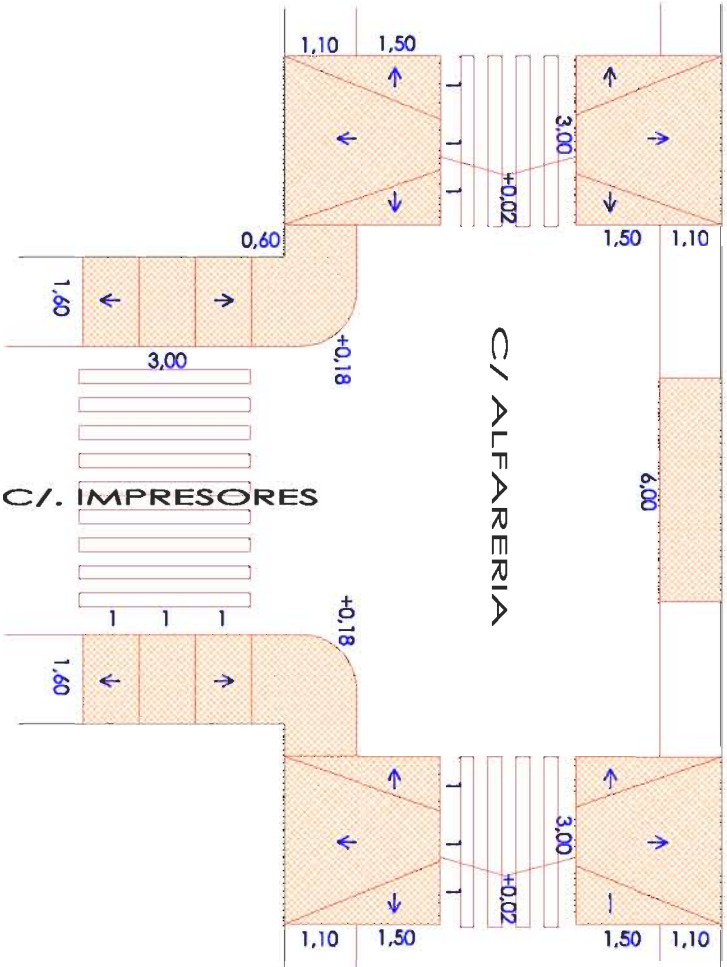


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EQUIPO ASISTENTE DE LORCA SERVICIOS TÉCNICOS		PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA SITUACION: C/ ALFARERIA CON C/ IMPRESORES		(14º FASE)	
	TITULO:	283	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA:	FEBRERO-08	

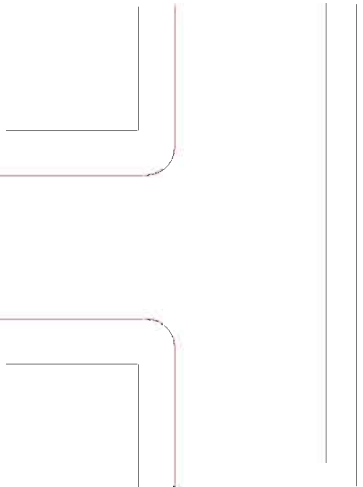

ESTADO ACTUAL

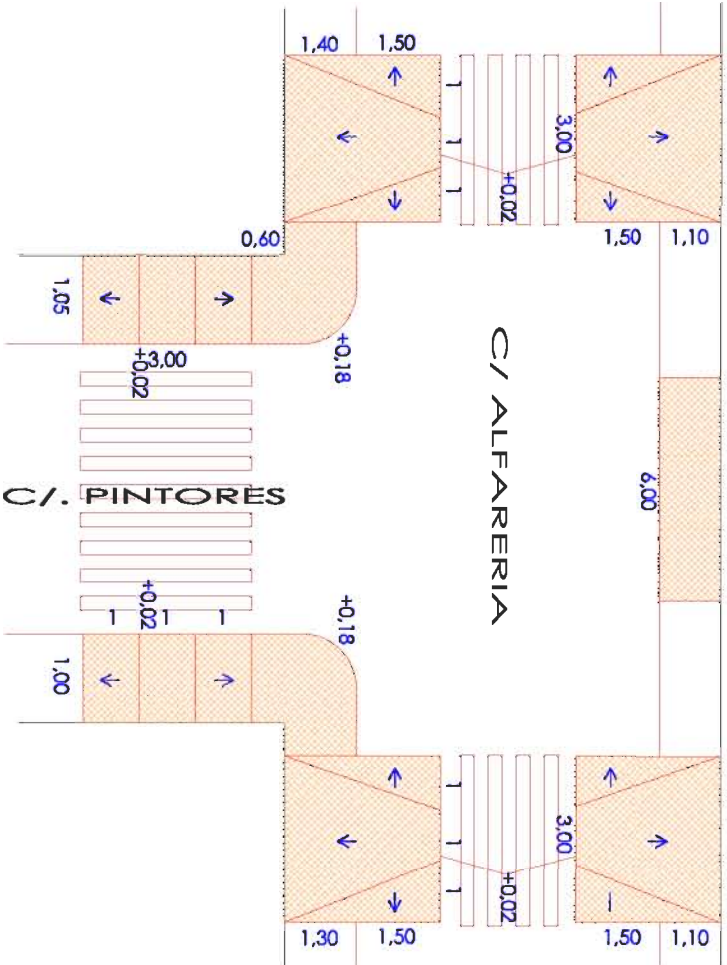


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EQUIPO ASISTENTE DE LORCA SERVICIOS TÉCNICOS		PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA		(14º FASE)
	TITULO:	284	SITUACION:	C/ ALFARERIA CON C/ PINTORES	
TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO			FECHA: FEBRERO-08		

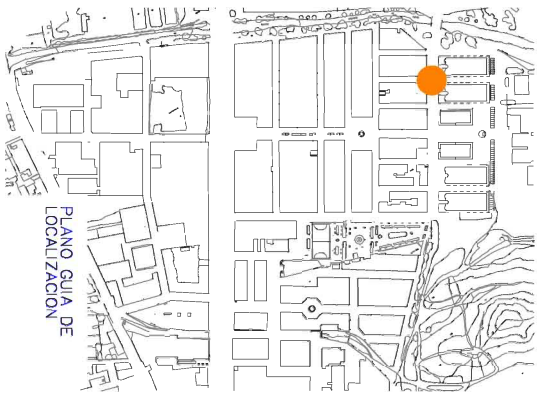

0285 Calle Cerámica con Alfarería

ESTADO ACTUAL

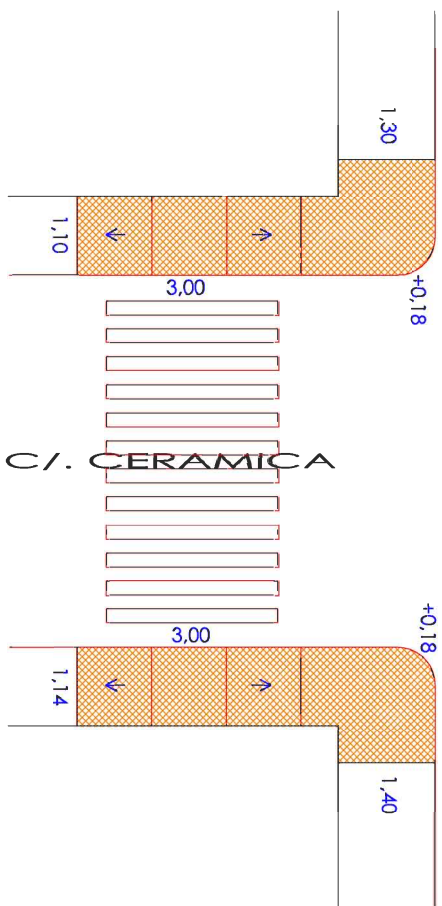


C/ ALFARERIA

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO RECIBO, APROBACIÓN DE LICENCIA SERVICIOS TÉCNICOS
TÍTULO: 285	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTO:NICAS EN BARRIO DE LA VINA
SITUACIÓN: C. ALFARERIA CON C. CERRAJERIA	(14º FASE)
TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08





0286 Calle Forjadores con Alfarrería

ESTADO ACTUAL

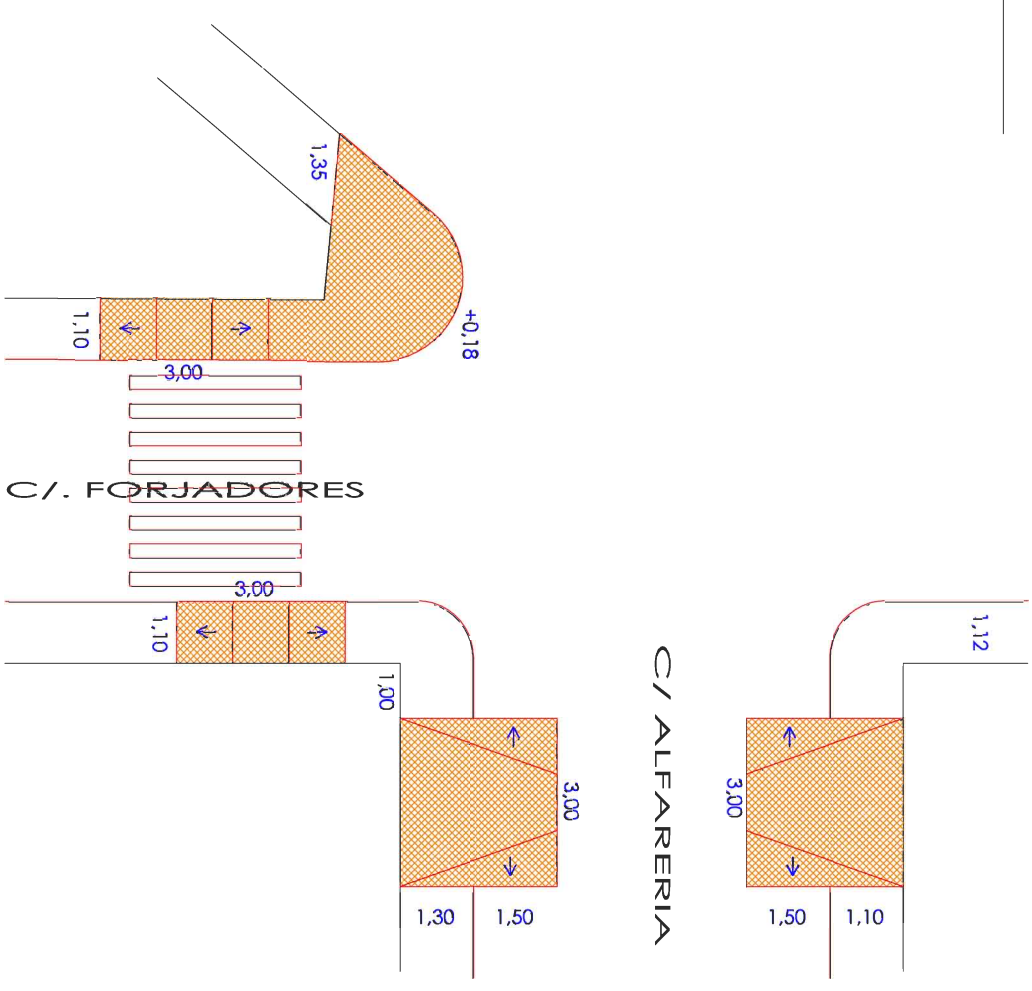


C/ ALFARERIA


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXMO. ALCALDE SERVICIOS TÉCNICOS
TÍTULO: 286	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA SITUACION: C/. FORJADORES CON C/. ALFARERIA
	FECHA: FEBRERO-08

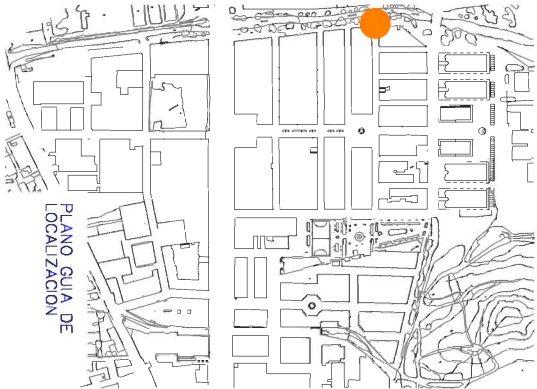


ESTADO ACTUAL

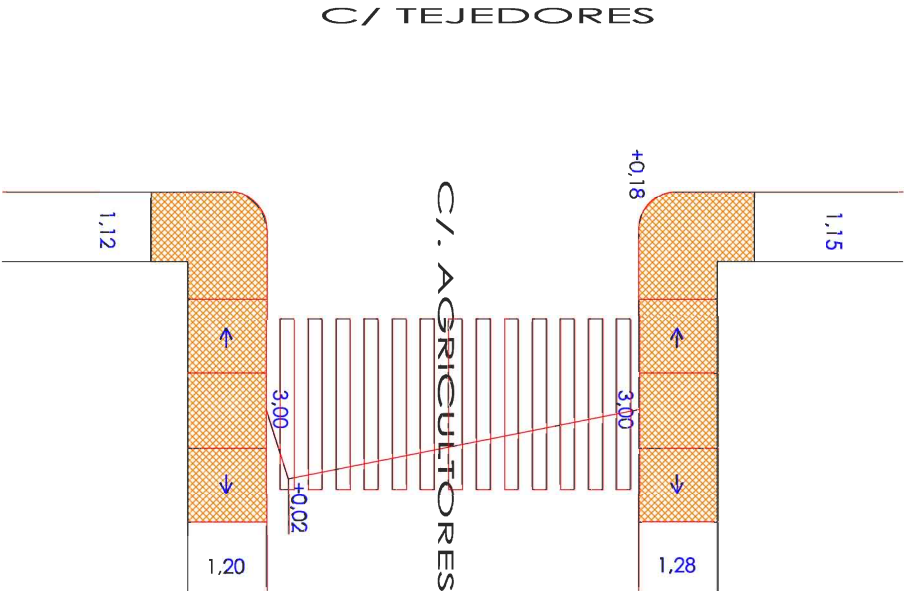


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DE TAGO SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	(1º FASE)
TÍTULO: 287	SITUACIÓN: C/. AGRICULTORES CON C/. TEJEDORES	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08




ESTADO ACTUAL

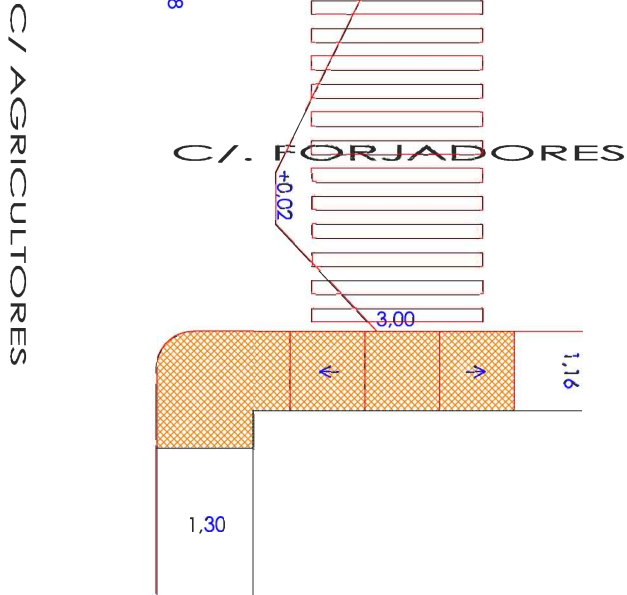

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DE TAGO SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	(1º FASE)
TÍTULO: 288	SITUACIÓN: C/. AGRICULTORES CON C/. FORJADORES	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08




ESTADO ACTUAL

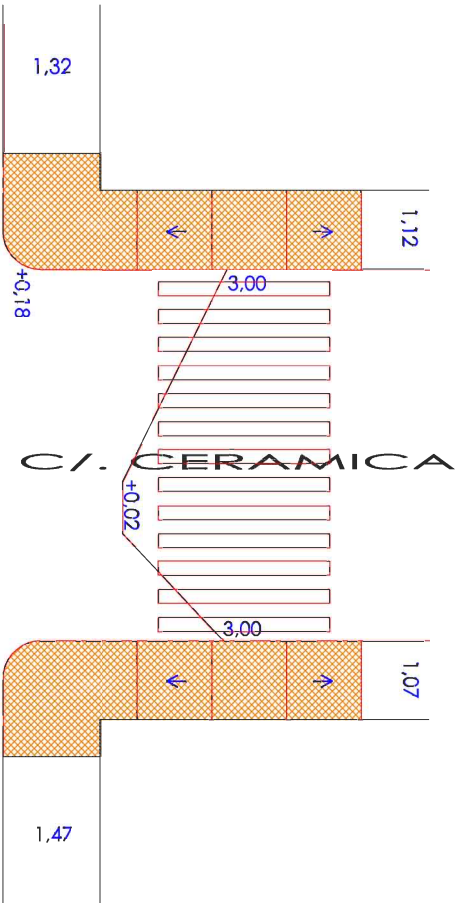


C/ AGRICULTORES

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA SERVICIOS TECNICOS		PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA (14º FASE)
	TITULO: 289		
SITUACION: C/. CERAMICA CON C/. AGRICULTORES		TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08





ESTADO ACTUAL


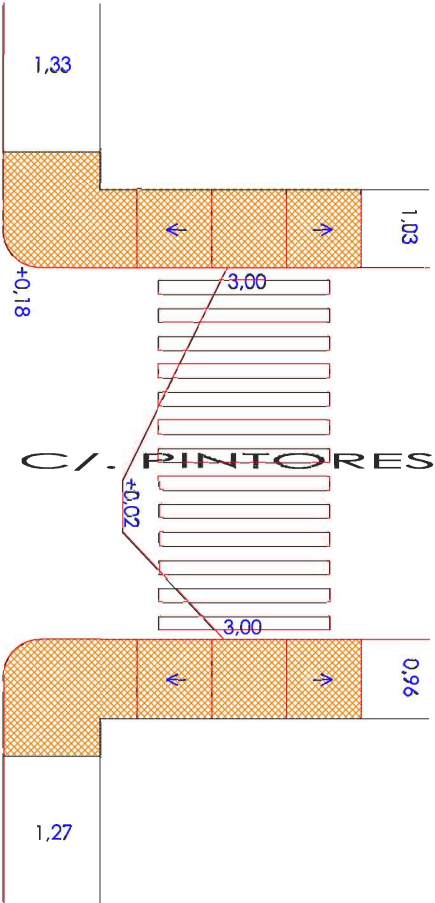


C/ AGRICULTORES



		GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA SERVICIOS TÉCNICOS		PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA (14º FASE)
TÍTULO: 290		SITUACIÓN: C/. PINTORES CON C/. AGRICULTORES		
TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO			FECHA: FEBRERO-08	

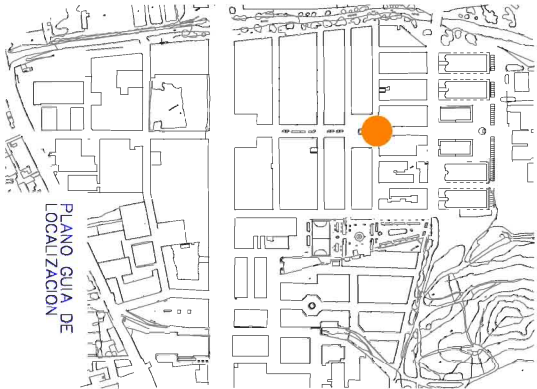


ESTADO ACTUAL

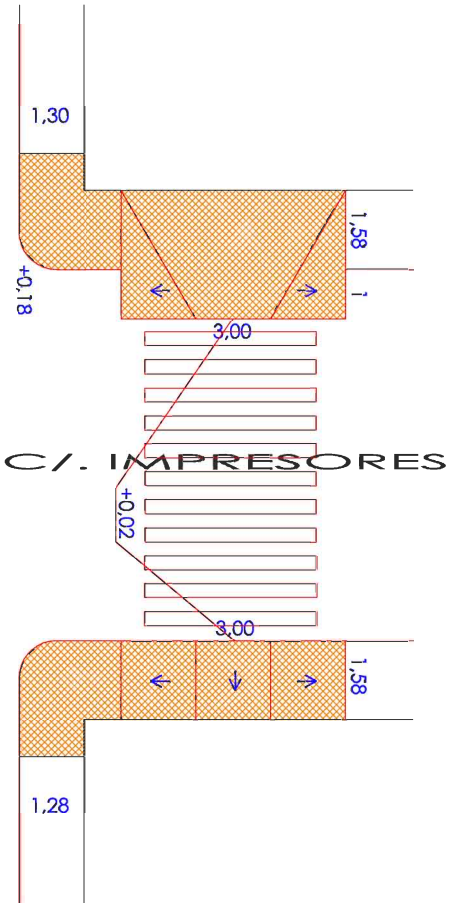



	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXENJO, APOYAMIENTO DE LUCHA SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA	(14º FASE)
	TÍTULO: 291	SITUACIÓN: C/. IMPRESORES A PLAZA	TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO FECHA: FEBRERO-08

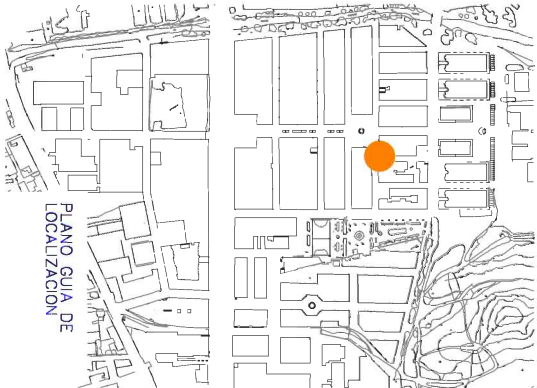


ESTADO ACTUAL

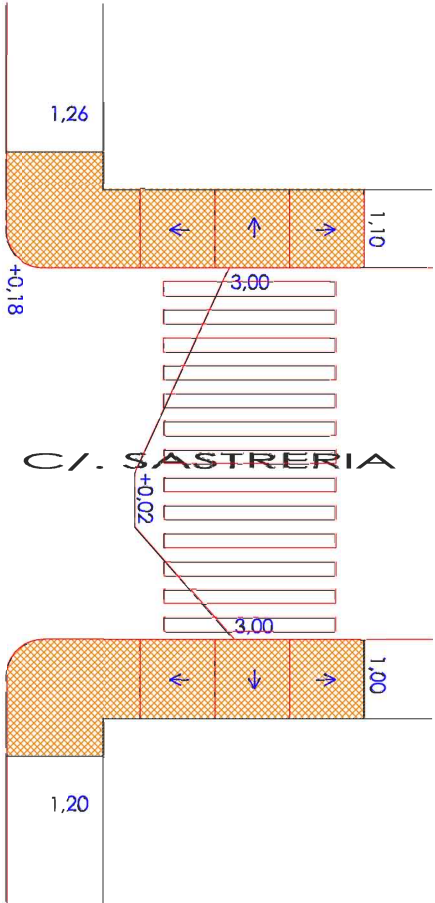

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXENJO, APOYAMIENTO DE LUCHA SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA	(14º FASE)
	TÍTULO: 292	SITUACIÓN: C/. SASTRERIA CON C/. AGRICULTORES	TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO FECHA: FEBRERO-08

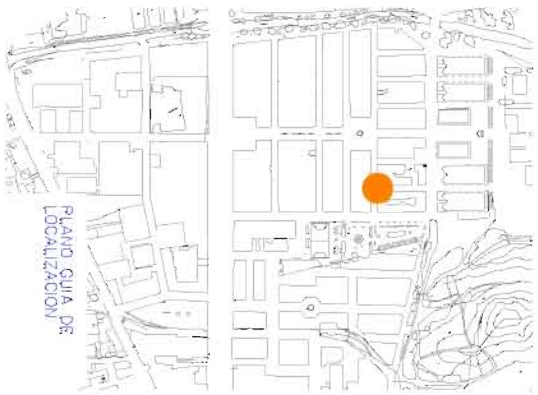

ESTADO ACTUAL

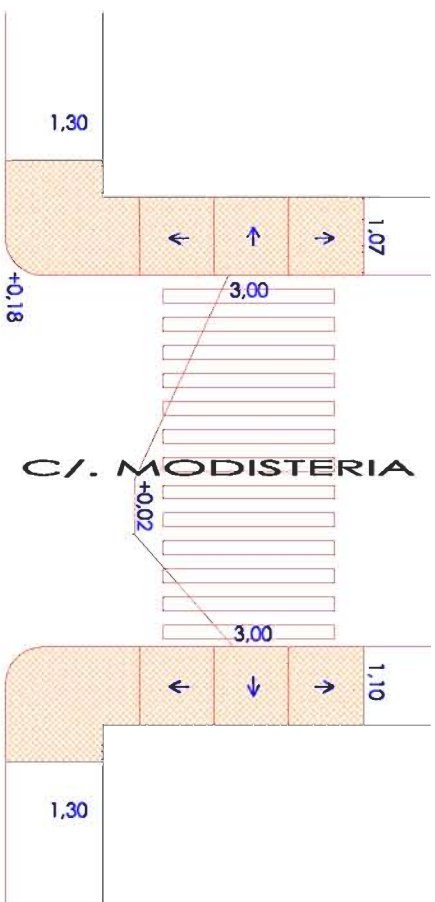

C/ AGRICULTORES


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO LOCAL: AVANCEMENTO DE LOCAL SERVIDORES TÉCNICOS
TÍTULO: 293	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA (14º FASE)
SITUACION: C/. MODISTERIA CON C/. AGRICULTORES	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO FECHA: FEBRERO-08




0295 Frente calle Panadería entrada al Parque



0295 Calle Panadería con Albañilería

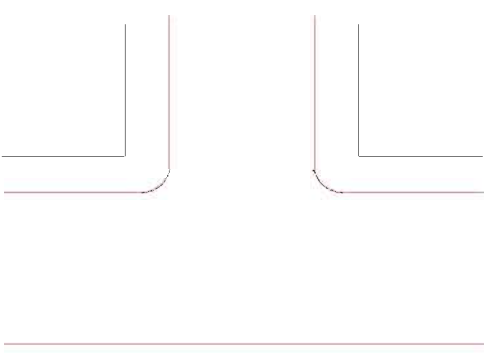

ESTADO ACTUAL

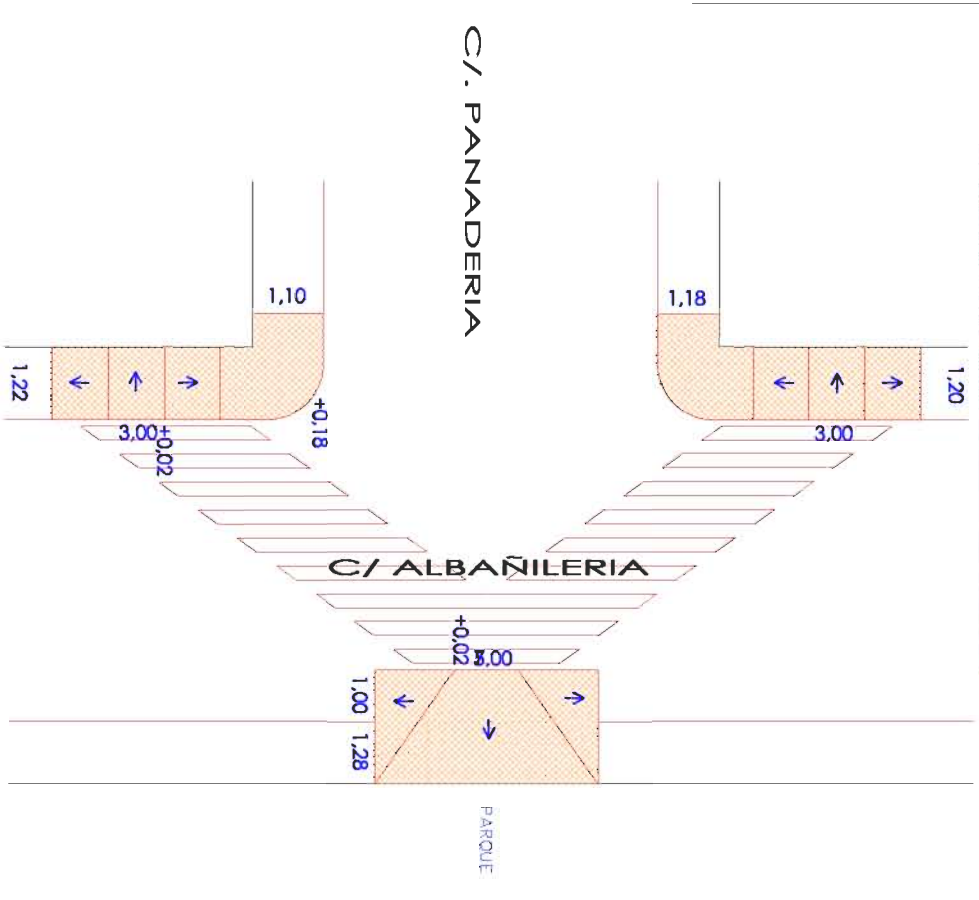


	EXPERIENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO, ACTIVIDADES DE OBRAS, SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARREERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA (14º FASE)
TÍTULO:	295	SITUACIÓN: C/.PANADERIA CON C/. ALBAÑILERIA
TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ REICHE-ELENA, JIMENEZ BAQUERO	FECHA:	FEBRERO-08



0294 Calle Agricultores con Albañilería




0294 Calle Agricultores con Albañilería

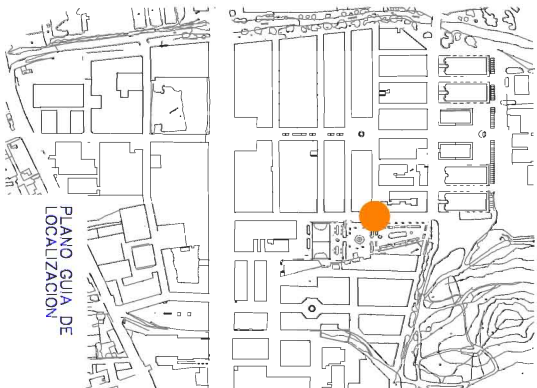

0294 Calle Albañilería con Agricultores y Parque

ESTADO ACTUAL

C/. AGRICULTORES

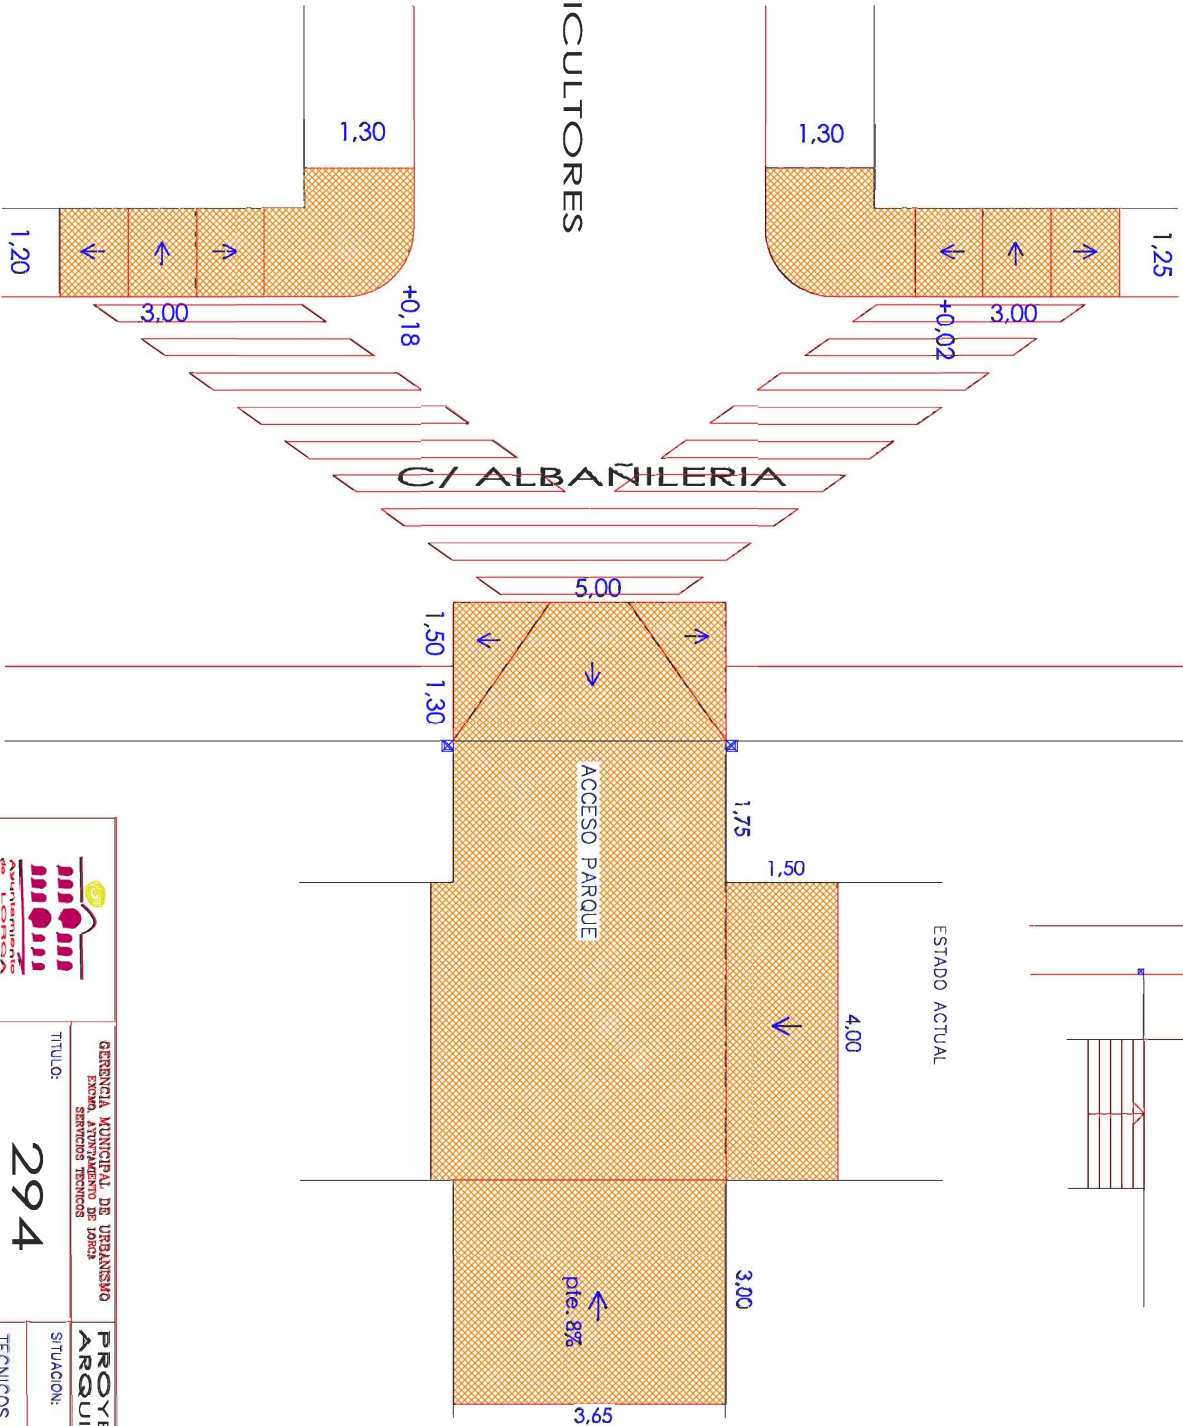


ESTADO ACTUAL

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	(14º FASE)
	EXPO. ASESORAMIENTO DE JORNADA SERVICIOS TECNICOS		
TITULO:	294	SITUACION:	C/. ALBAÑILERIA, AGRICULTORES, ACCESO PARQUE
TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08	




ESTADO ACTUAL

C/ PANADERI A nº7




	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DE SEGURA SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	(1º FASE)
	TITULO:	SITUACION:	
	296	CALE PANADERIA	
TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08	

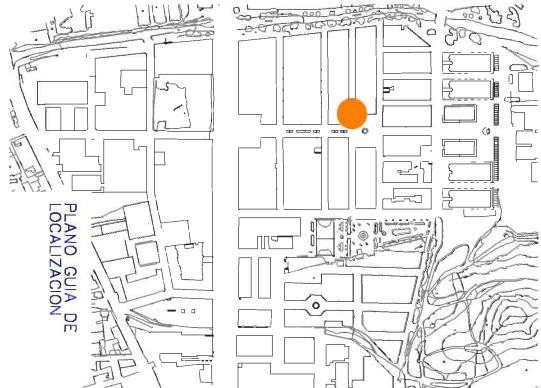


ESTADO ACTUAL


C/ PANADERIA Nº 9




	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DE SEGURA SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	(1º FASE)
	TITULO:	SITUACION:	
	297	CALE PANADERIA	
TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08	

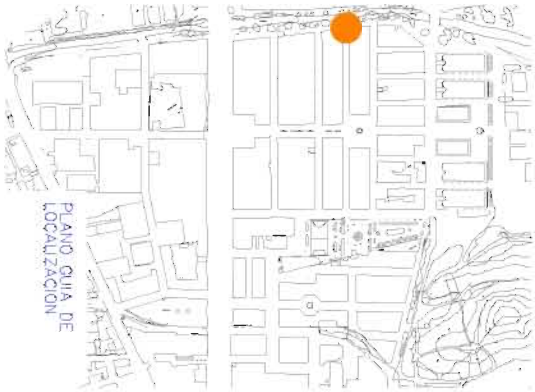

0298 Calle Tejedores con Panadería

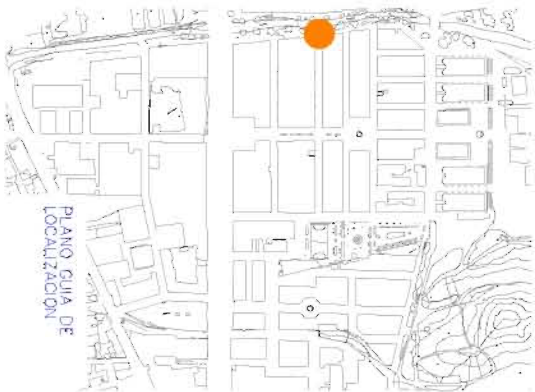

0299 Calle Tejedores con Jardinería




ESTADO ACTUAL










ESTADO ACTUAL



C/ TEJEDORES

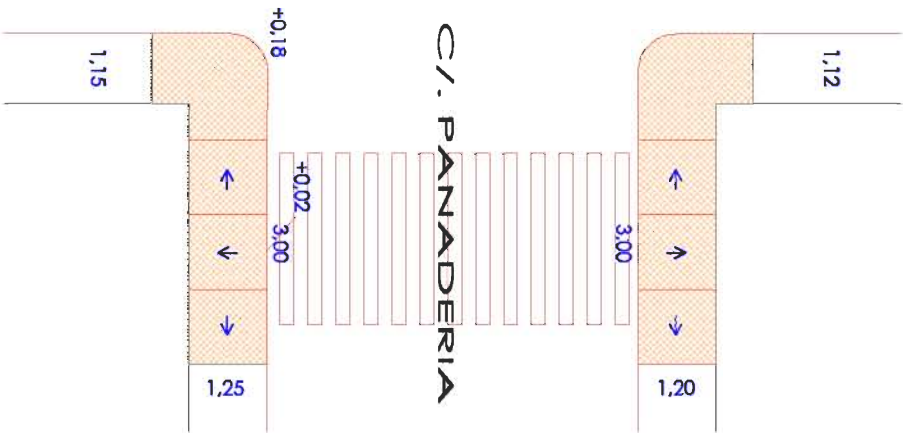




C/ TEJEDORES

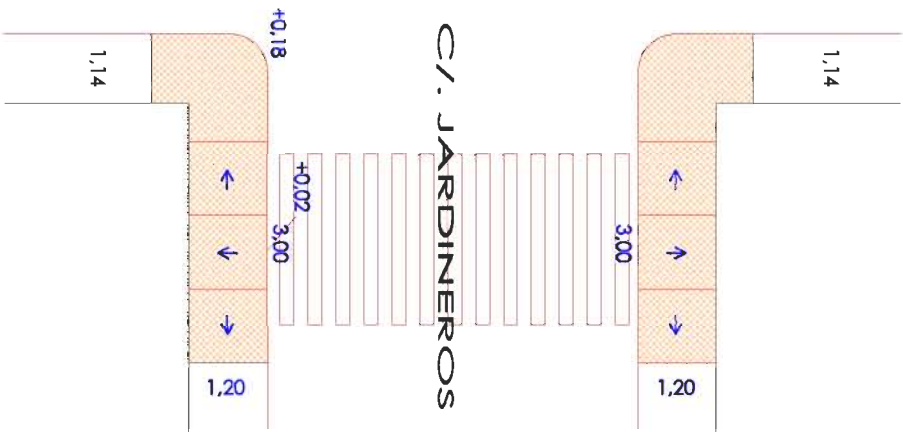

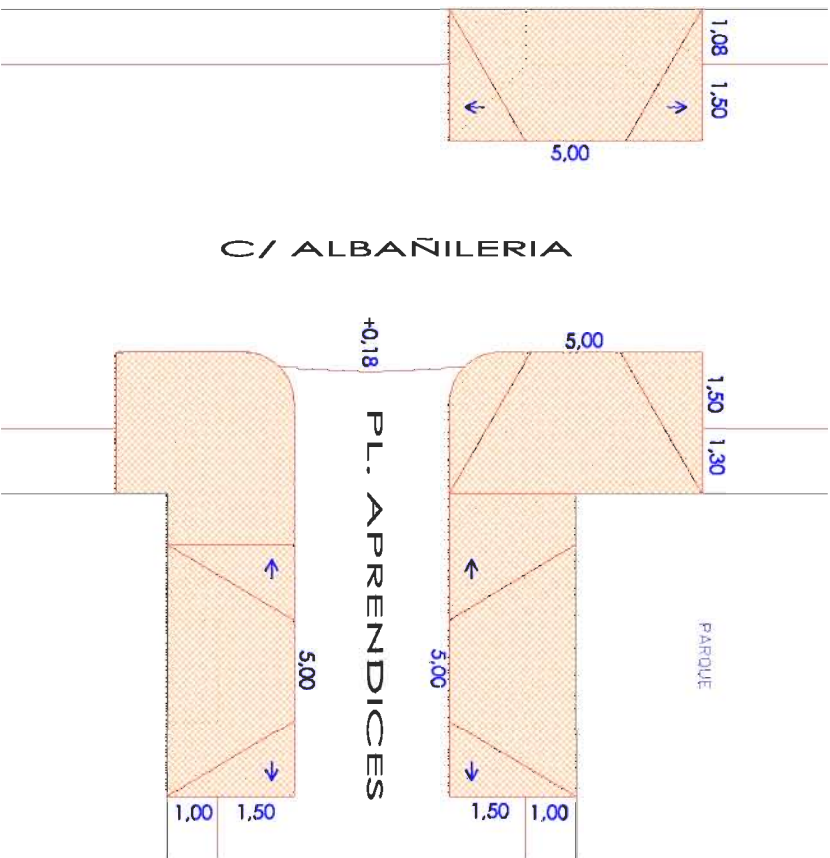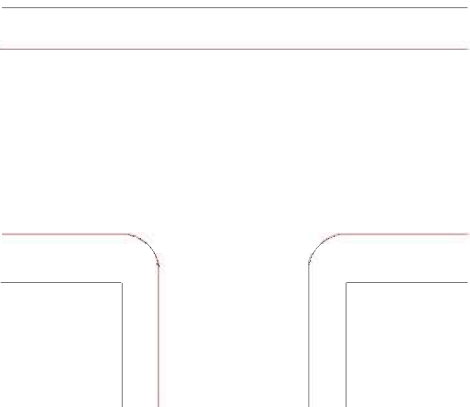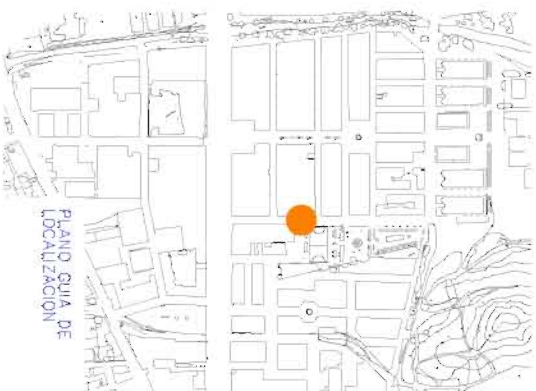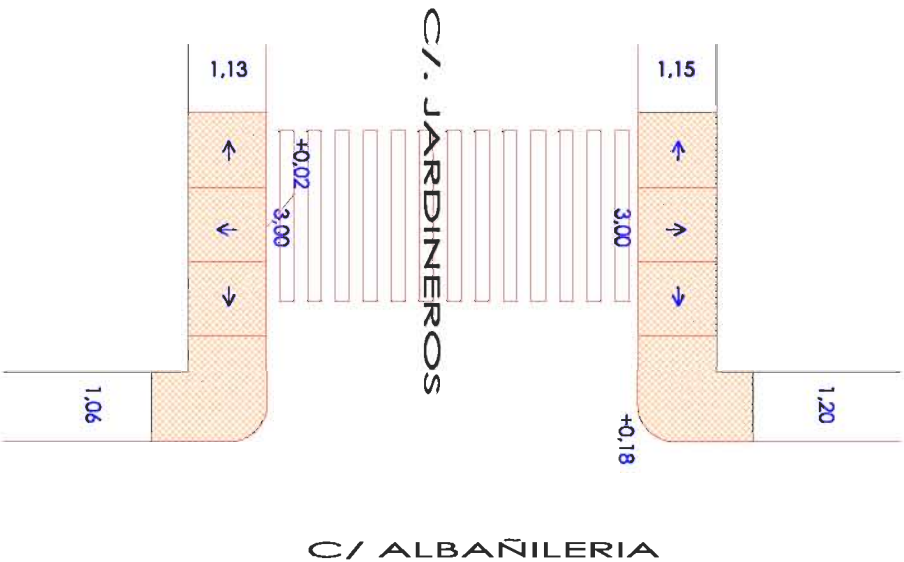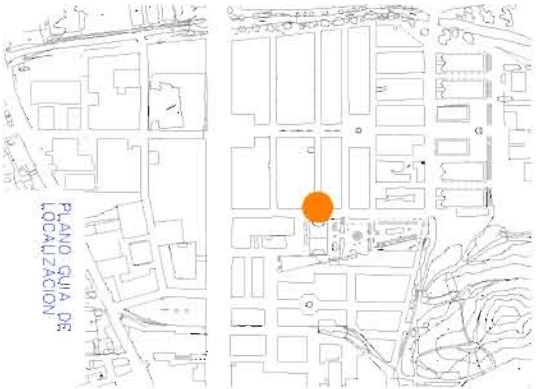




ESTADO ACTUAL


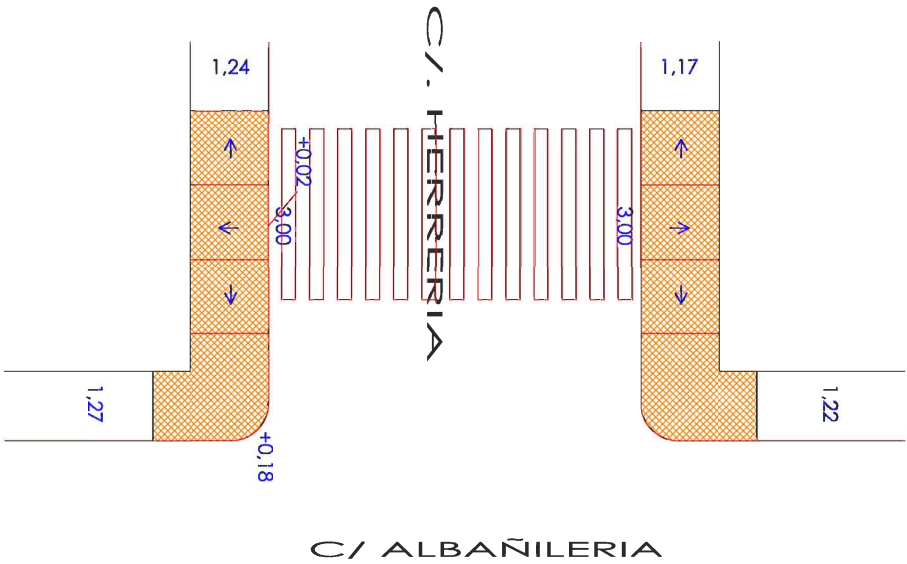


ESTADO ACTUAL


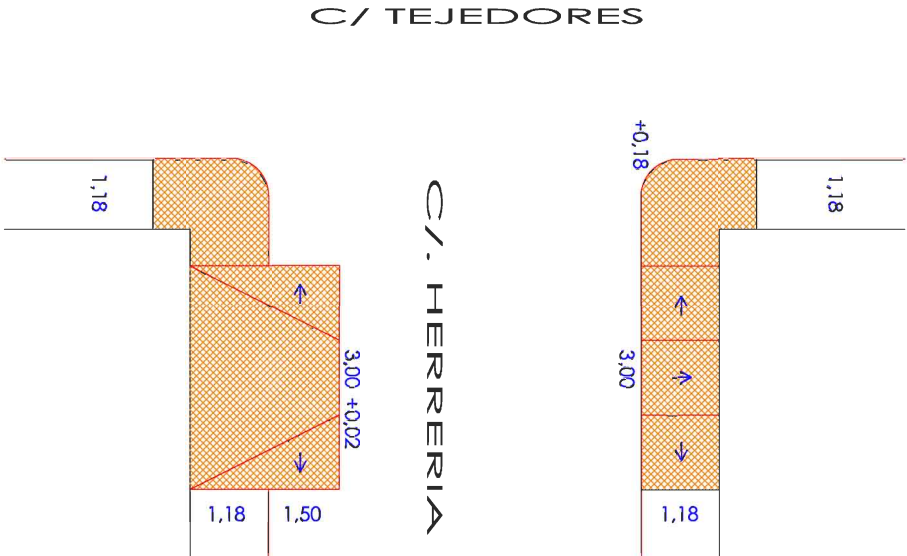


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DE SEGURA	
	SERVICIOS TÉCNICOS	
TÍTULO:	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS	
302	ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	
	SITUACION: C/. HERRERIA CON C/. ALBAÑILERIA	
TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	
	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORA DE SEGURA	
	SERVICIOS TÉCNICOS	
TÍTULO:	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS	
303	ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA	
	SITUACION: C/. TEJEDORES CON C/. HERRERIA	
TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08

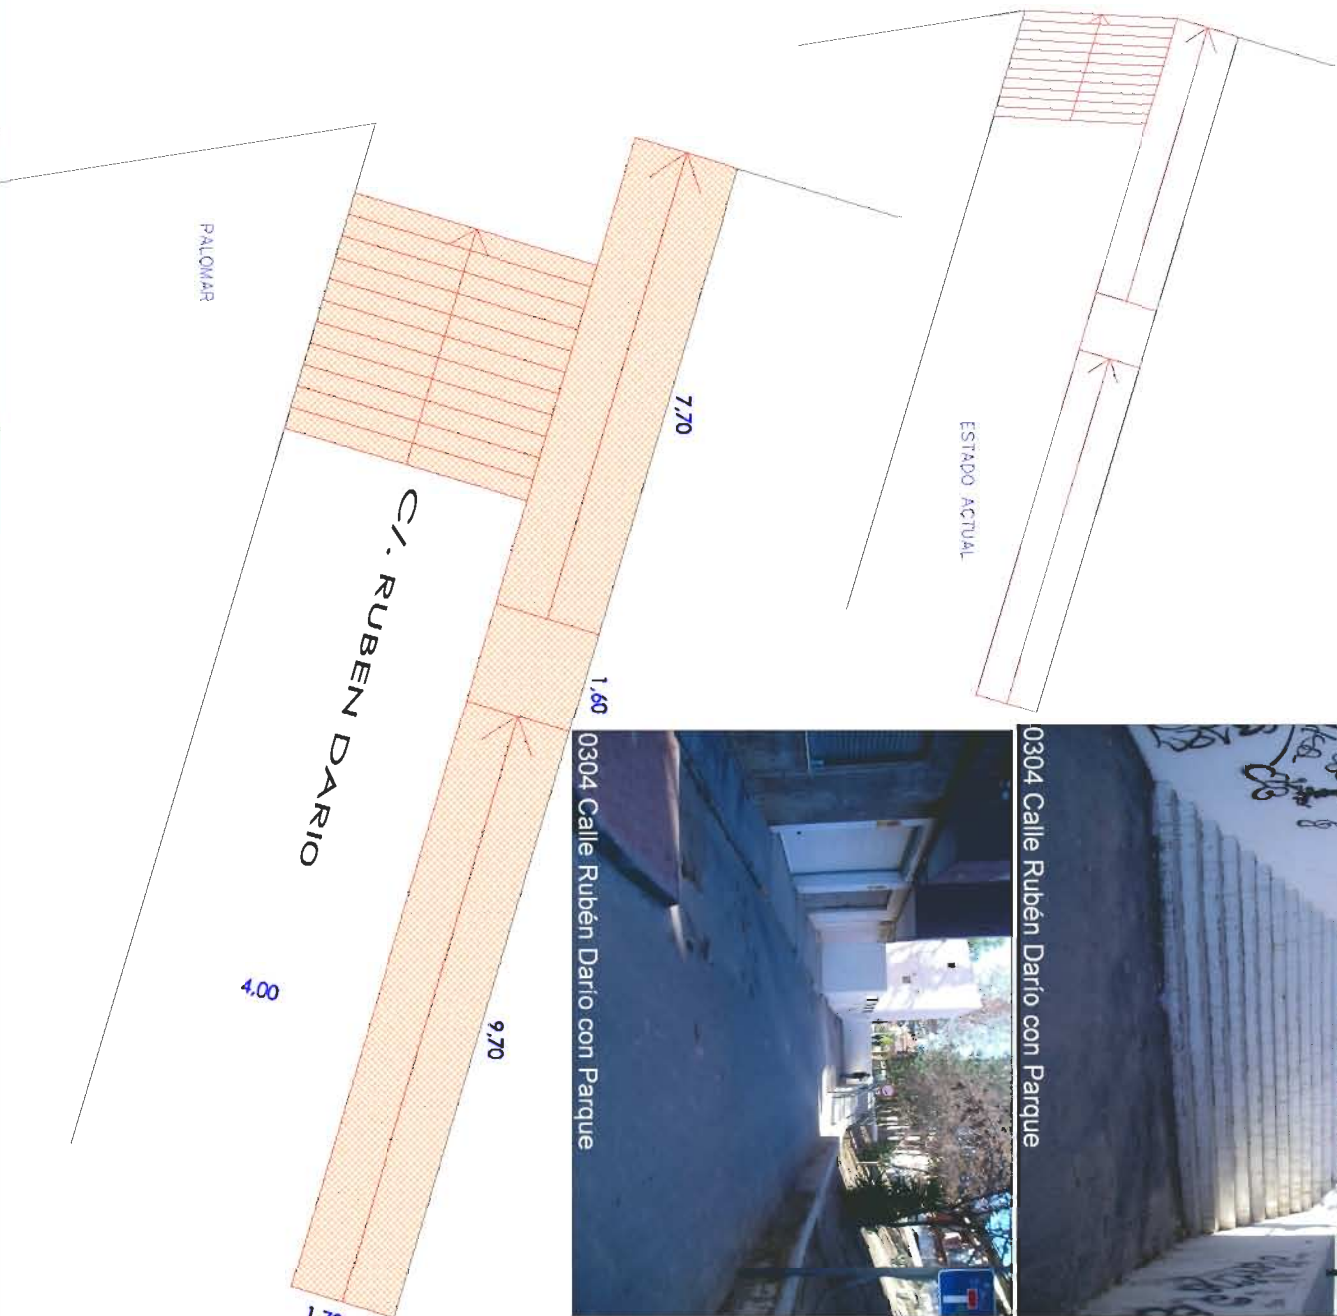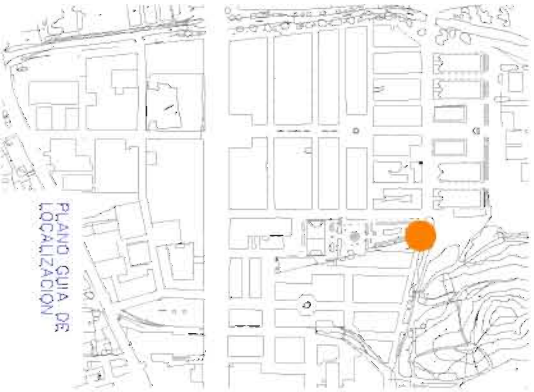


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO, AVANZAMIENTO DE OBRA SERVICIOS TECNICOS	
	TITULO:	304
PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA		(14º FASE)
SITUACION:		C/. RUBEN DARIO CON PARQUE
TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08

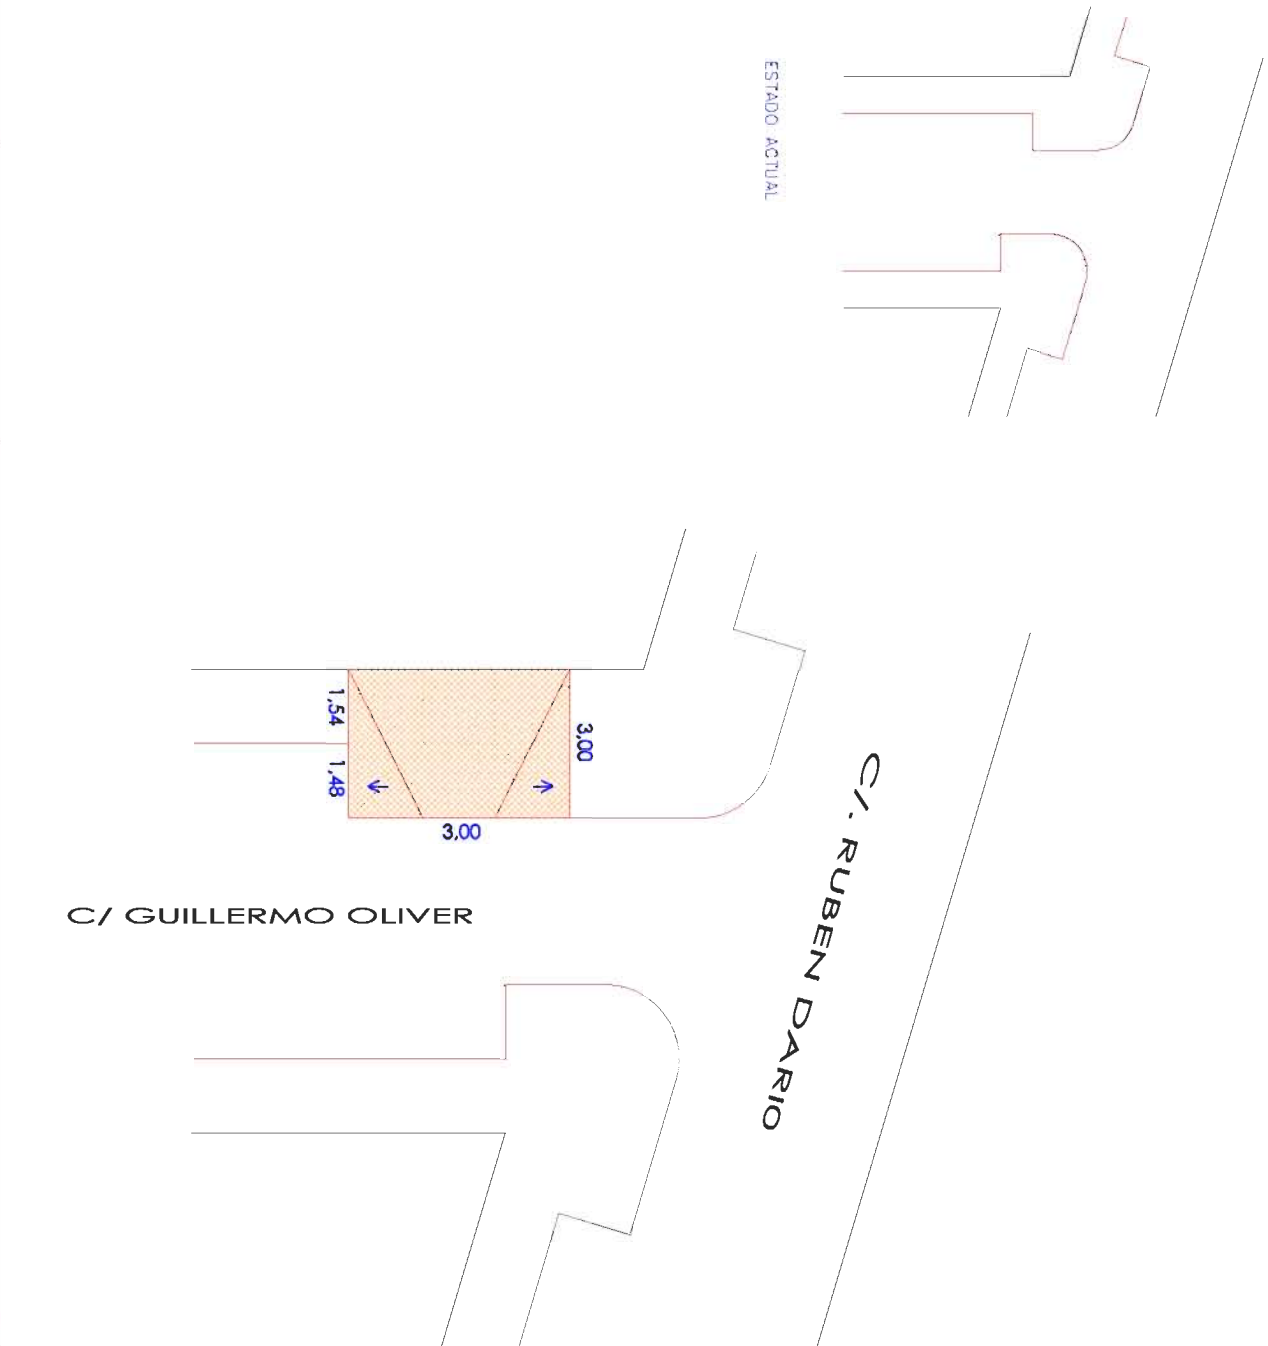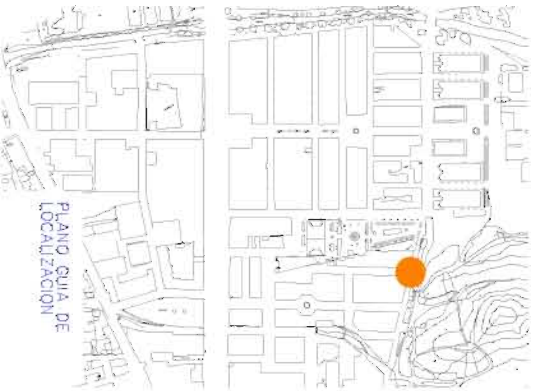




	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCISO, AVANZAMIENTO DE OBRA SERVICIOS TECNICOS	
	TITULO:	305
PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA		(14º FASE)
SITUACION:		C/. GUILLERMO OLIVER CON C/. RUBEN DARIO
TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08

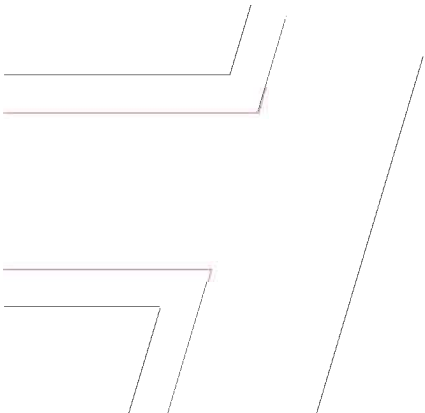


ESTADO ACTUAL

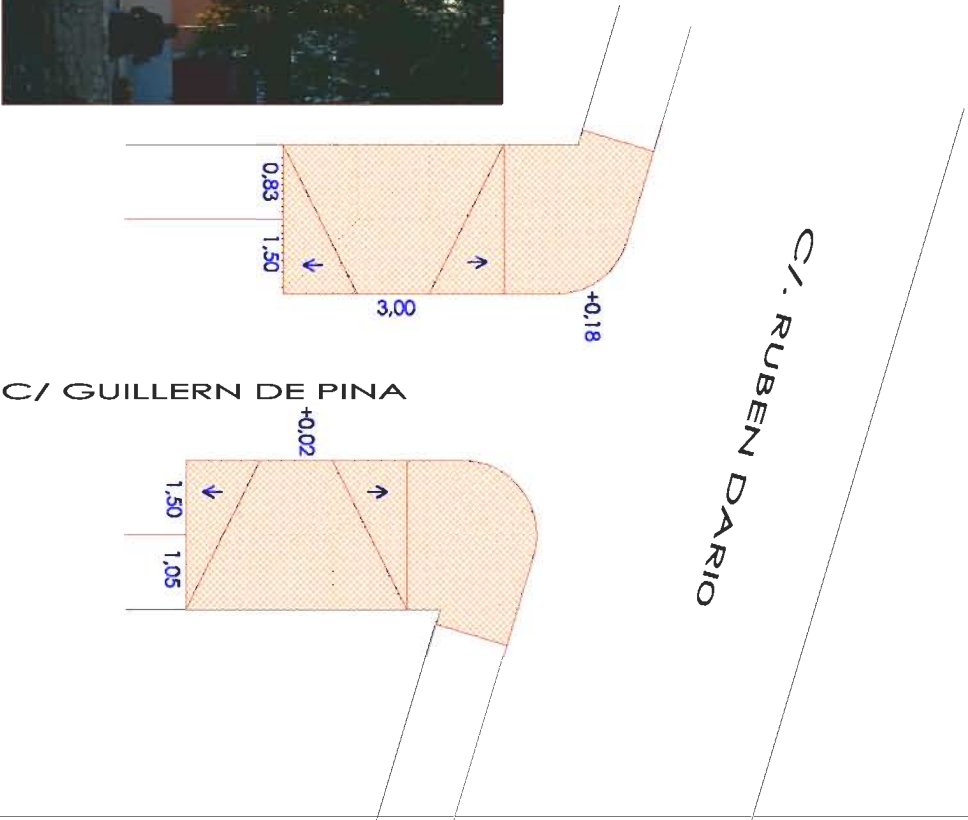




	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Dpto. ASESORAMIENTO DE LUGAR SERVIDORES TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA	(14º FASE)
TITULO:	SITUACION:	C/ GUILLÉN DE PINA CON C/. RUBÉN DARIO	
307	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08	

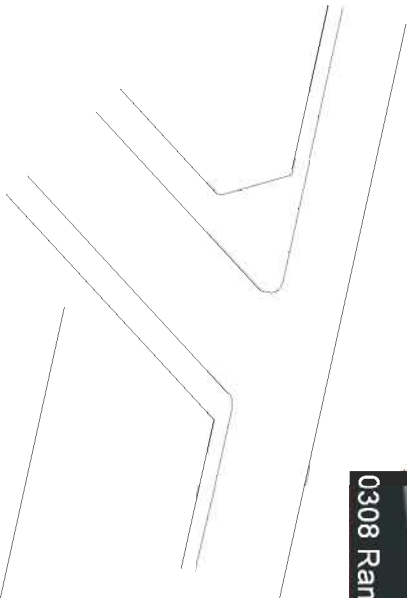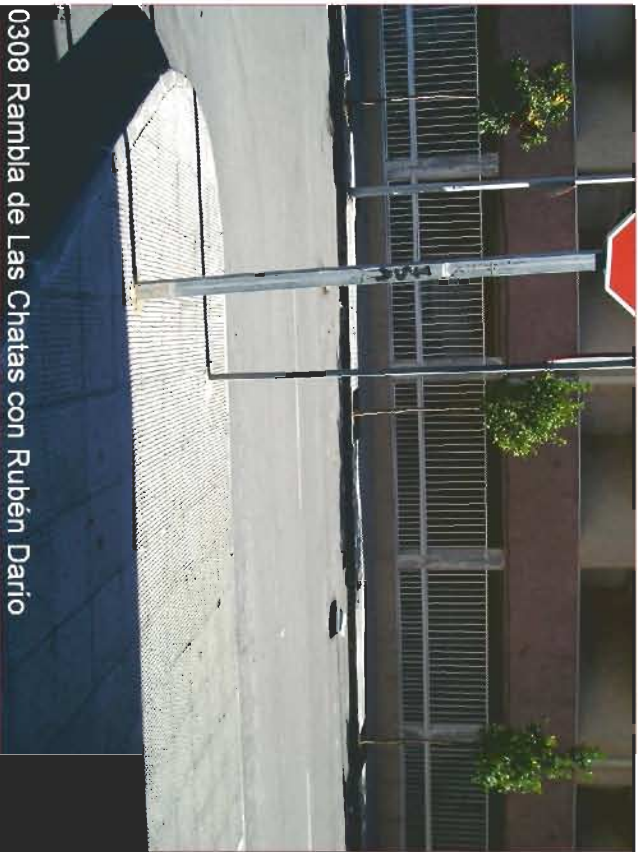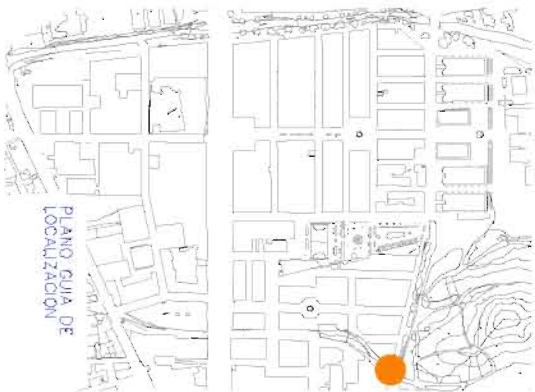




ESTADO ACTUAL

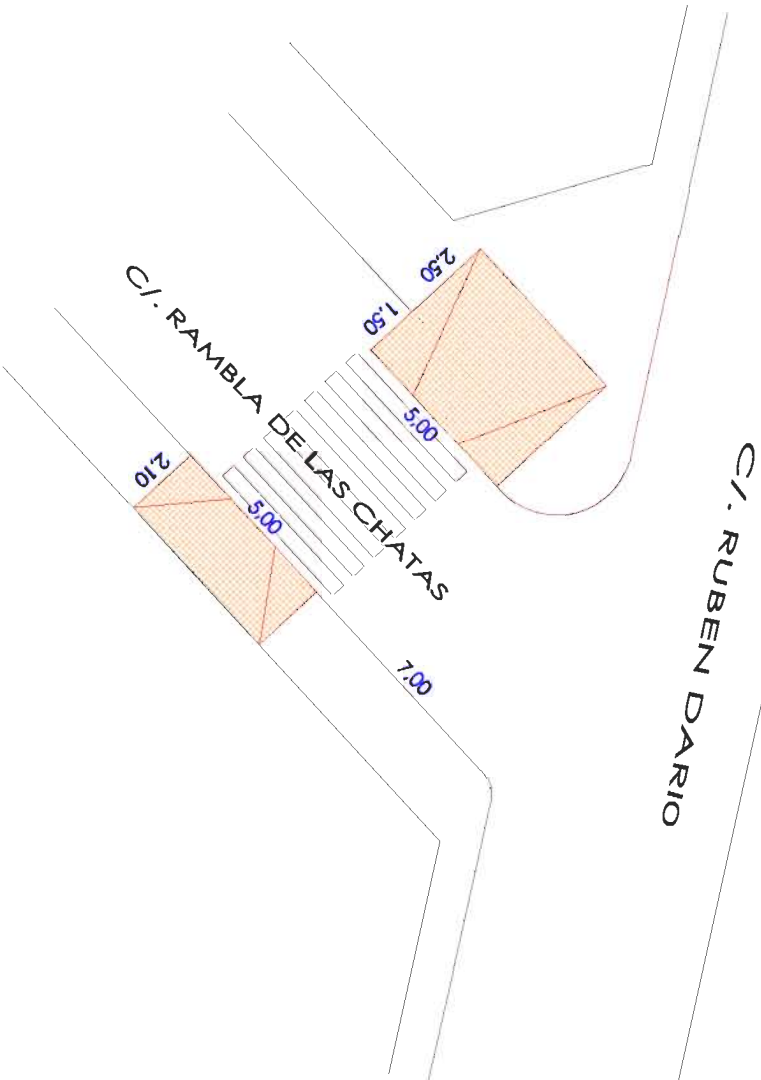




	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO Dpto. ASESORAMIENTO DE LUGAR SERVIDORES TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA	(14º FASE)
TITULO:	SITUACION:	RAMBLA LAS CHATAS CON C/. RUBÉN DARIO	
308	TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO	FECHA: FEBRERO-08	

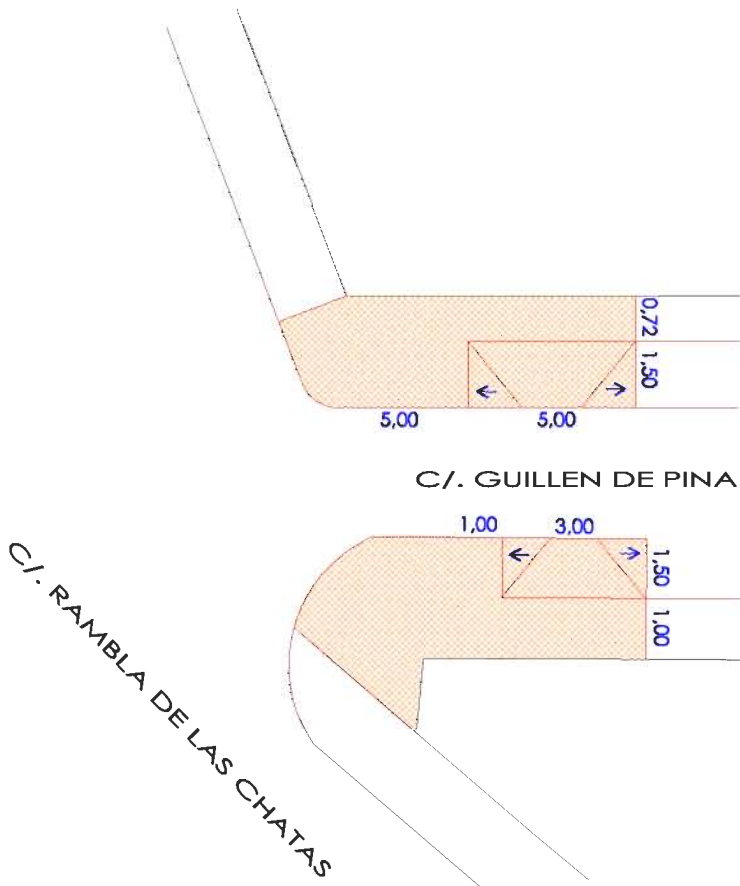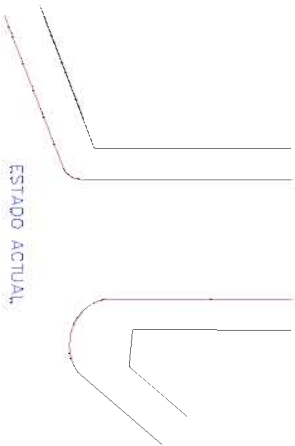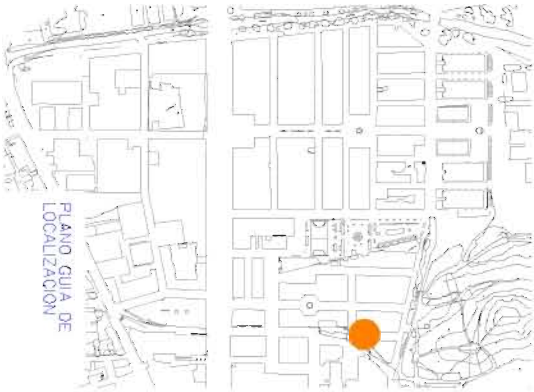




	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINA SERVICIOS TÉCNICOS	
	TÍTULO:	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA
309		SITUACION:
TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08
		(14ª FASE)
		C/. GUILLEN DE PINA CON RBLA. LAS CHATAS

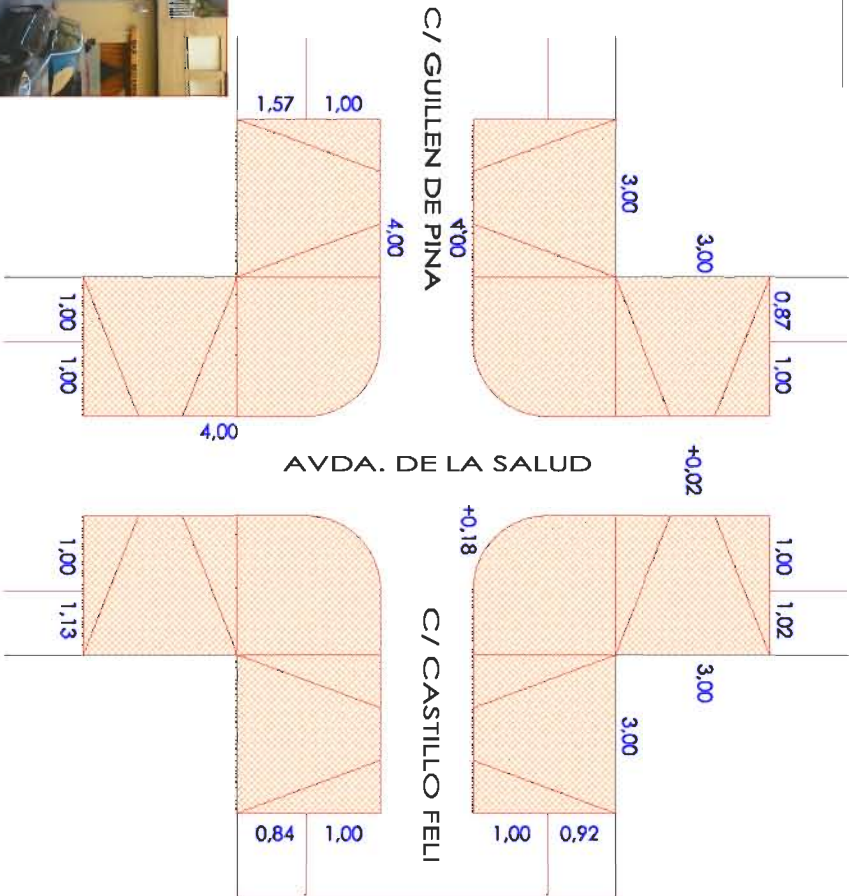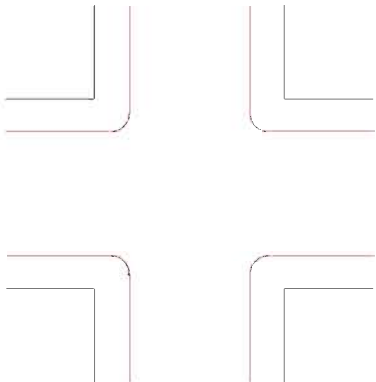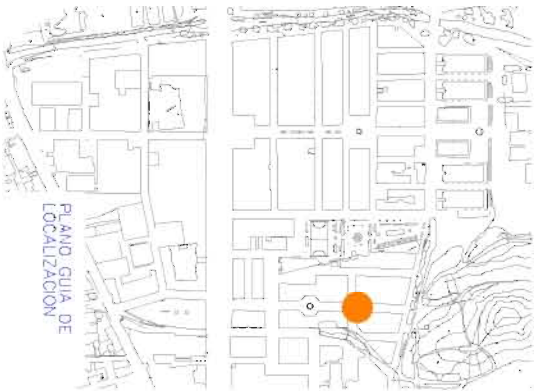




	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PINA SERVICIOS TÉCNICOS	
	TÍTULO:	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA
310		SITUACION:
TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08
		(14ª FASE)
		GUILLEN DE PINA, AVDA. LA SALUD Y CASTILLO FELI

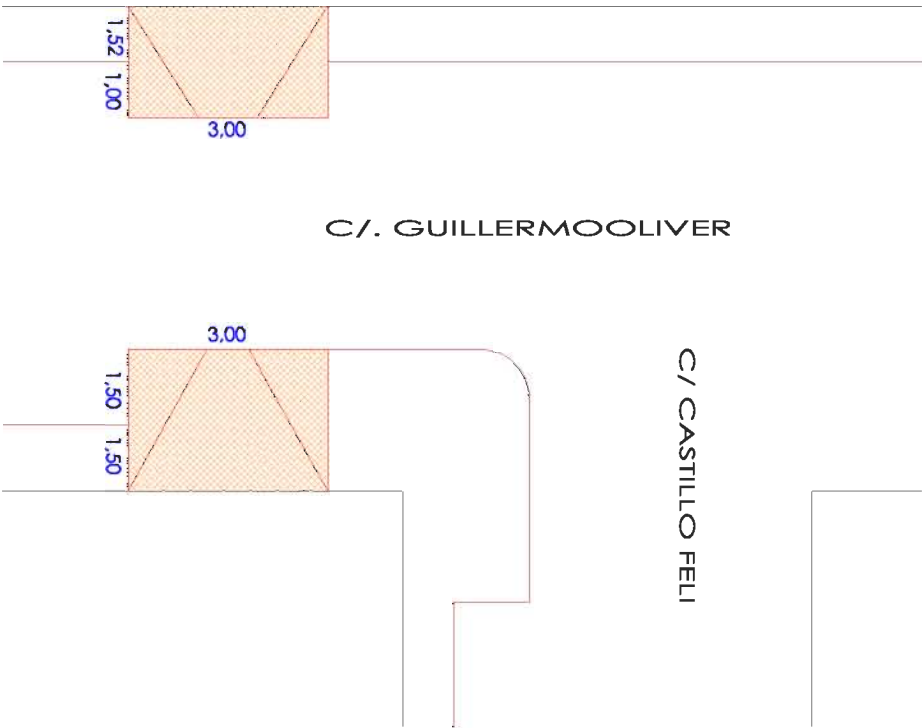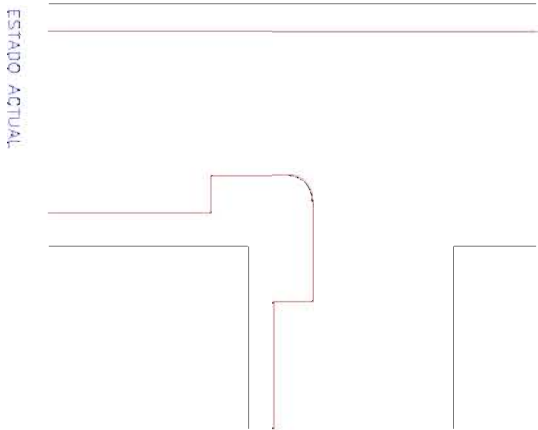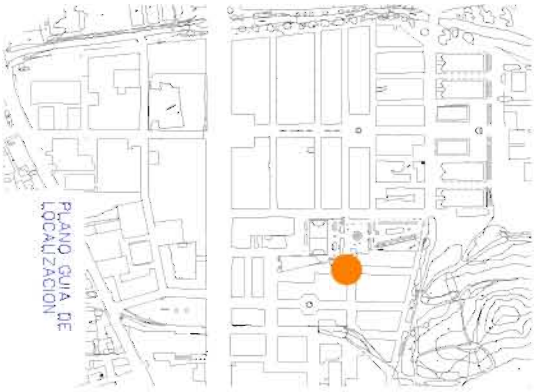

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EQUIPO AYUDANTAMIENTO DE LORCA SERVICIOS TÉCNICOS	
	TÍTULO:	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA
311	SITUACION:	C/. GUILLERMO OLIVER CON C/. CASTILLO FELI
TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08

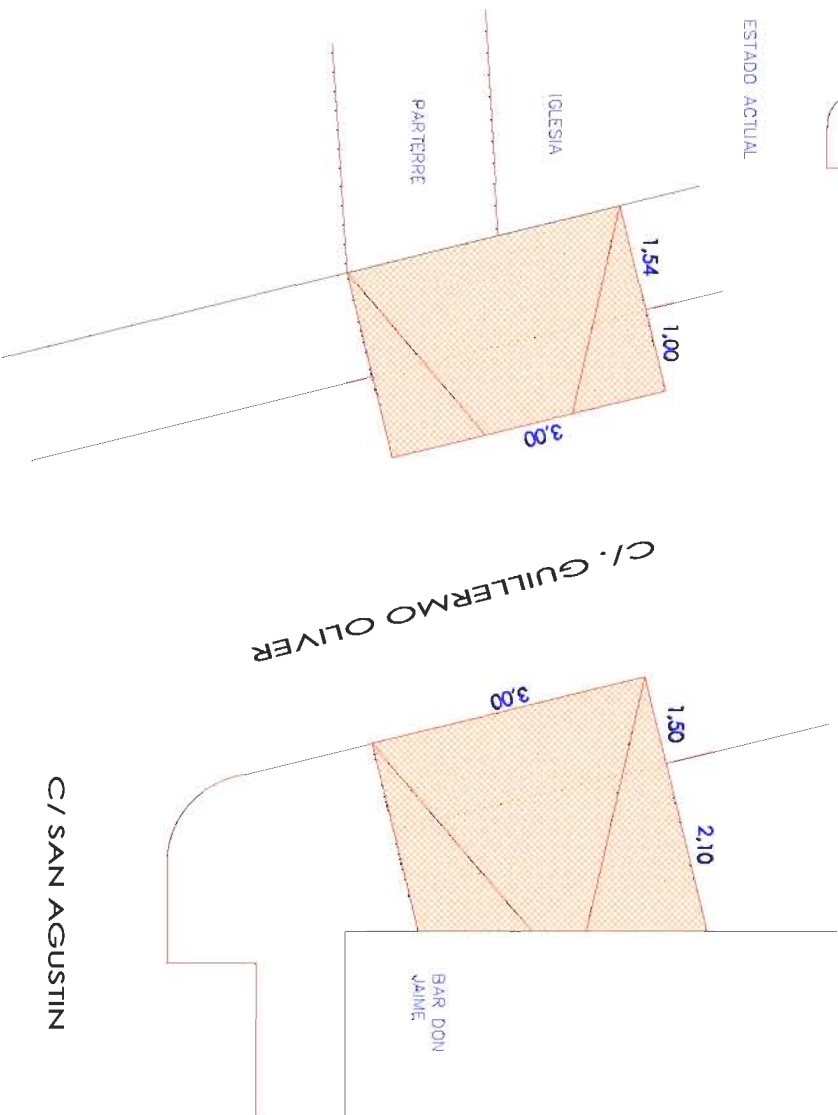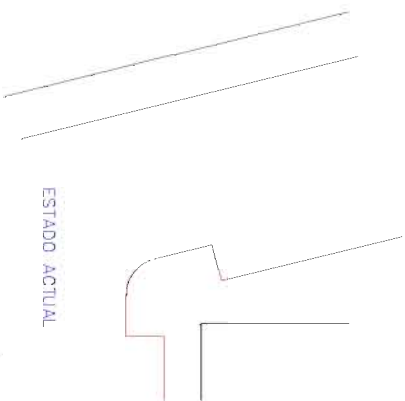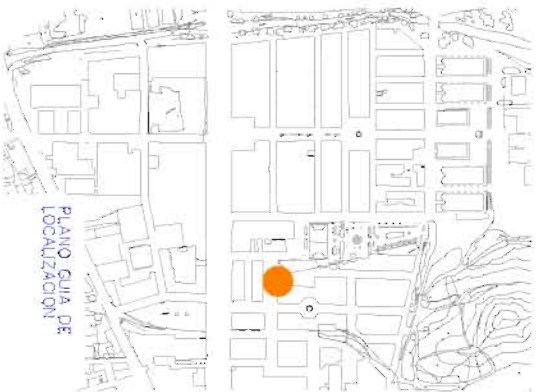


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EQUIPO AYUDANTAMIENTO DE LORCA SERVICIOS TÉCNICOS	
	TÍTULO:	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA
312	SITUACION:	C/. GUILLERMO OLIVER CON C/ SAN AGUSTIN
TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08

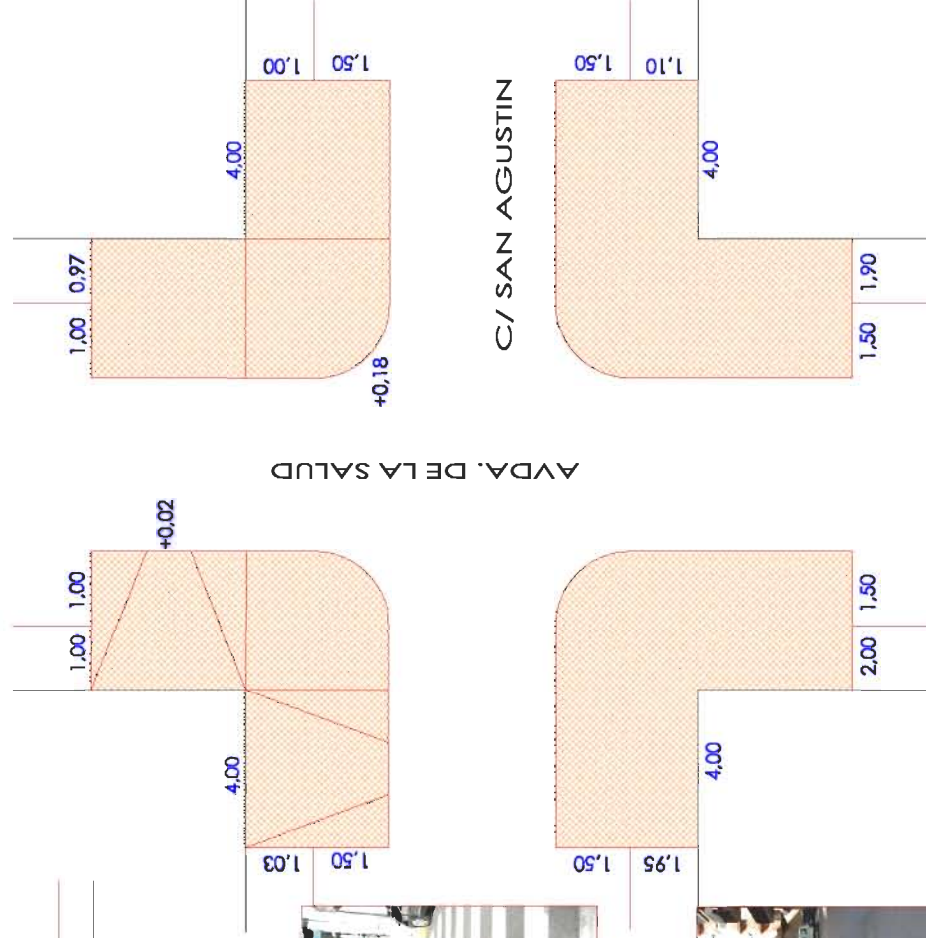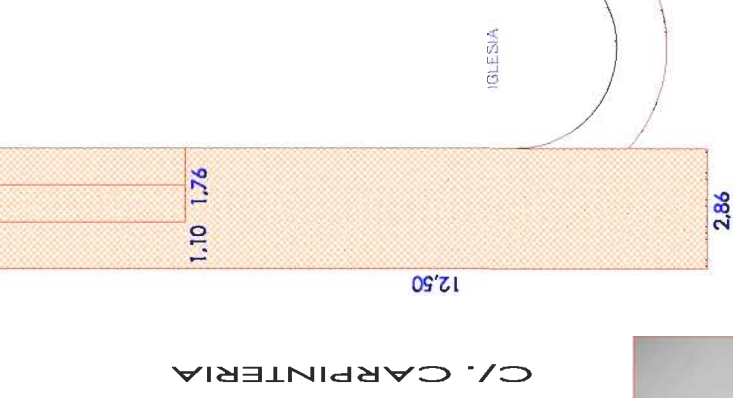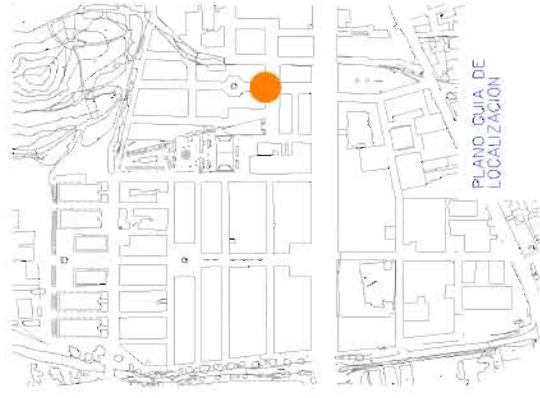




0316 Ramblas Las Chatas con Andrés Gª Soler

PLANO GUIA DE LOCALIZACION

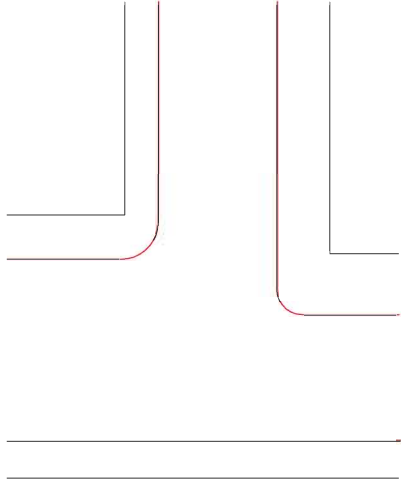


ESTADO ACTUAL

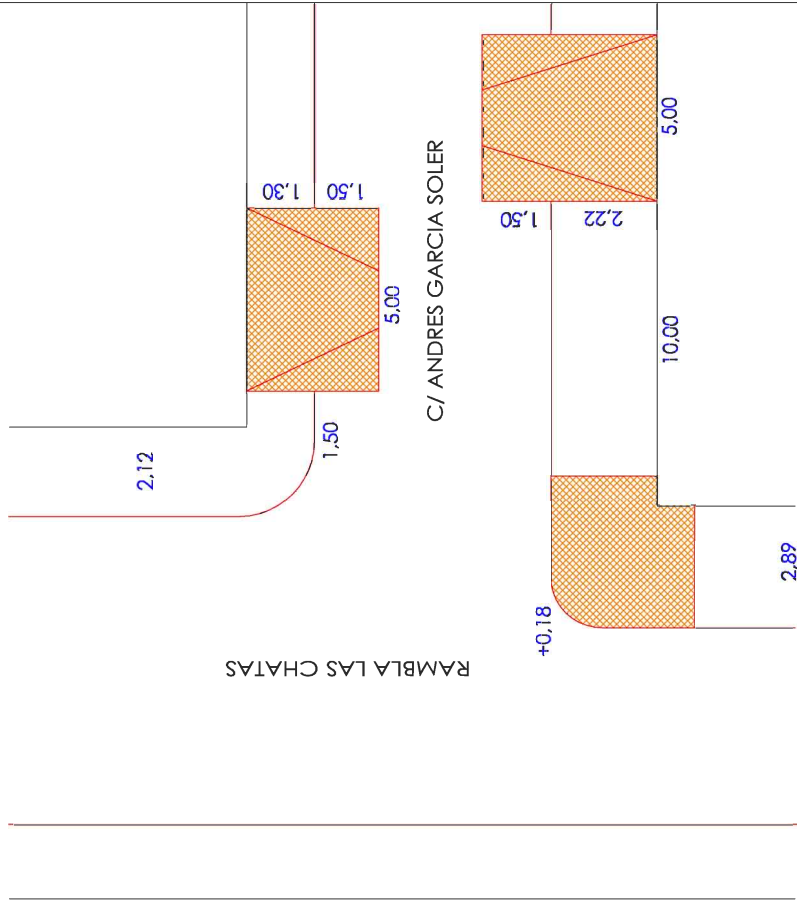

RAMBLA LAS CHATAS


C/ ANDRES GARCIA SOLER

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA (14º FASE)
	TITULO:	SITUACION: C/ ANDRES GARCIA SOLER CON RBLA. LAS CHATAS
	TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO FECHA: FEBRERO-08	

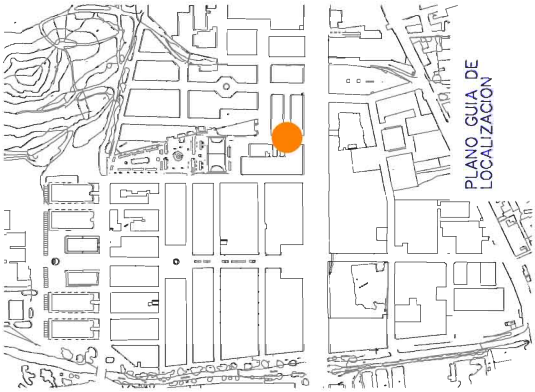


0317 Calle Carpintería con Zapateros

PLANO GUIA DE LOCALIZACION

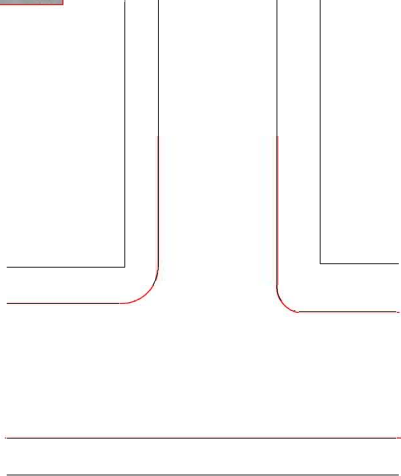


ESTADO ACTUAL

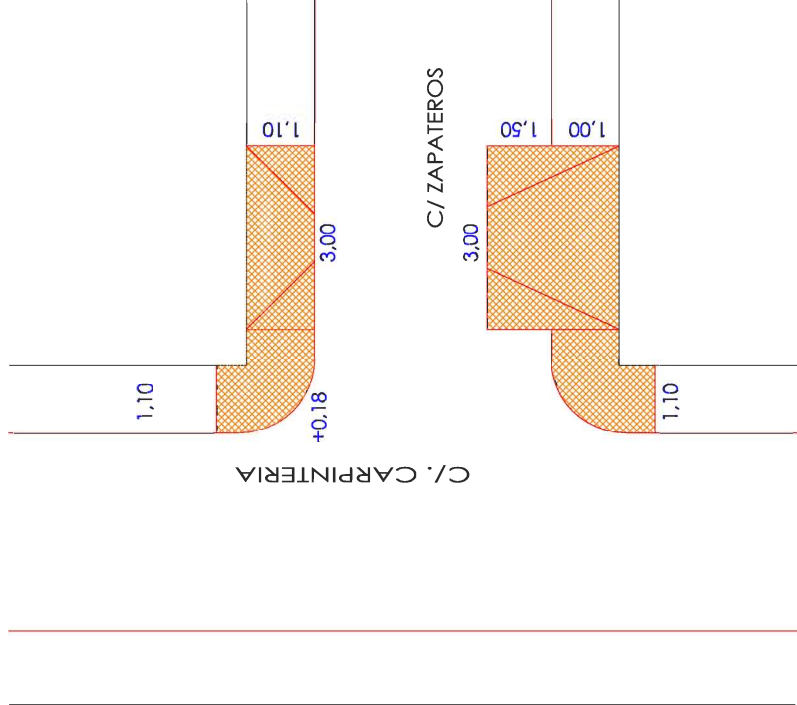

C/. CARPINTERIA

C/ ZAPATEROS


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LORCA SERVICIOS TÉCNICOS	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VINA (14º FASE)
	TITULO:	SITUACION: C/. ZAPATEROS CON C/. CARPINTERIA
	TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO FECHA: FEBRERO-08	

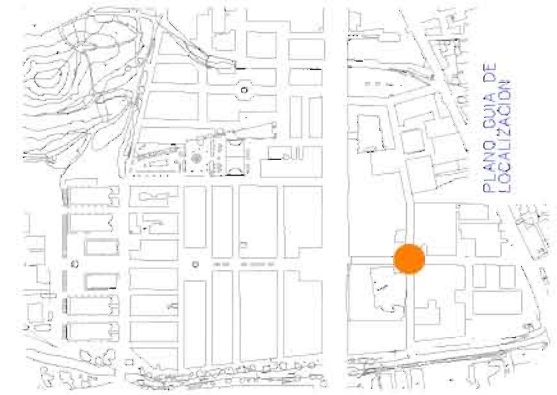


0318 Calle Talleres con Infante J Manuel (2)



0318 Calle Talleres con Infante J Manuel (3)



ESTADO ACTUAL

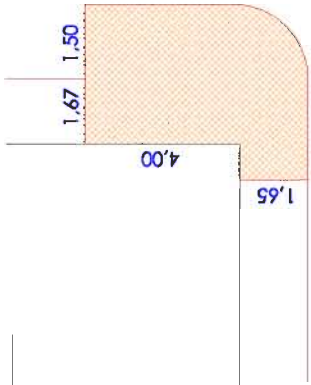


C/. INFANTE

C/ TALLERES




0318 Calle Talleres con Infante J Manuel


	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ENCARGO: ATENDIMIENTO DE LÓRICA SERVICIOS TÉCNICOS		PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA (14º FASE)	
	TÍTULO: 318		SITUACIÓN: C/. INFANTE CON C/. TALLERES	
	TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08	

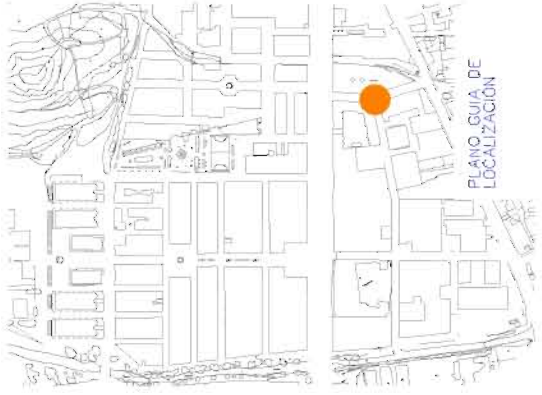

0319 Calle Talleres con Las Palomas



ESTADO ACTUAL

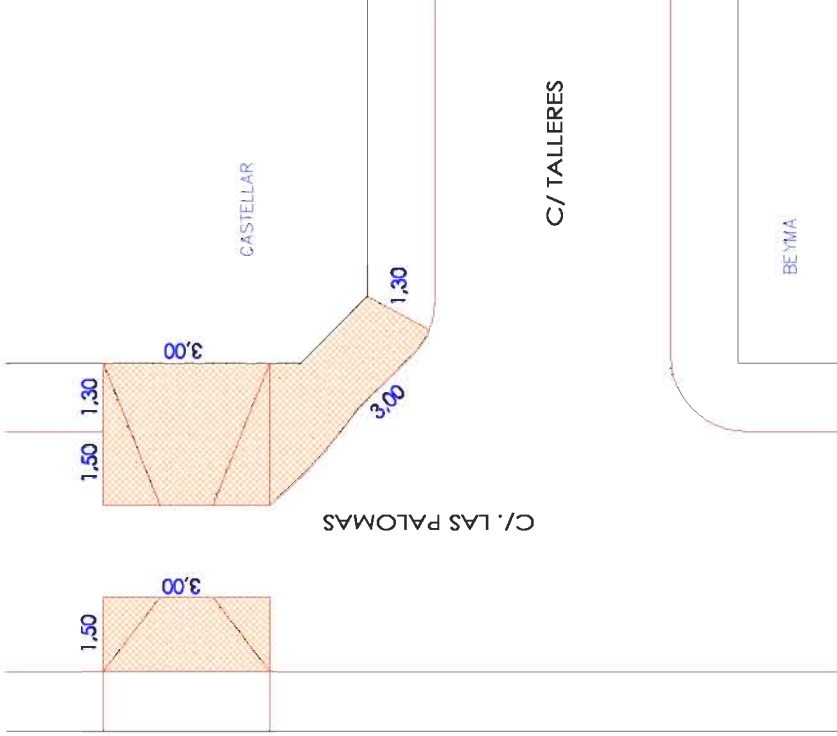


C/. LAS PALOMAS


C/ TALLERES

BEYMA



	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO ENCARGO: ATENDIMIENTO DE LÓRICA SERVICIOS TÉCNICOS		PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA (14º FASE)	
	TÍTULO: 319		SITUACIÓN: C/. TALLERES CON C/. LAS PALOMAS	
	TÉCNICOS REDACTORES: LUIS MARTÍNEZ RECHE-ELENA JIMÉNEZ BAQUERO		FECHA: FEBRERO-08	

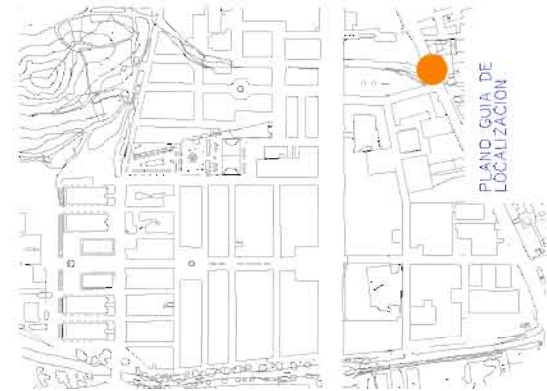

0320 Cº Viejo del Puerto




ESTADO ACTUAL

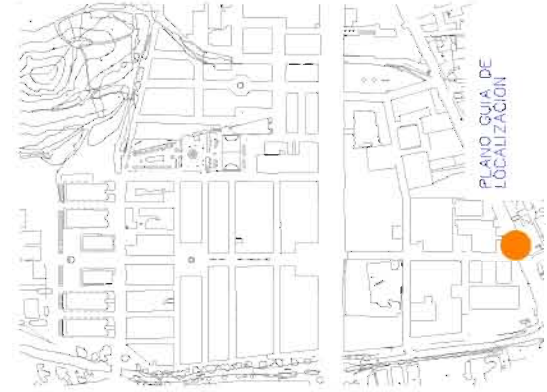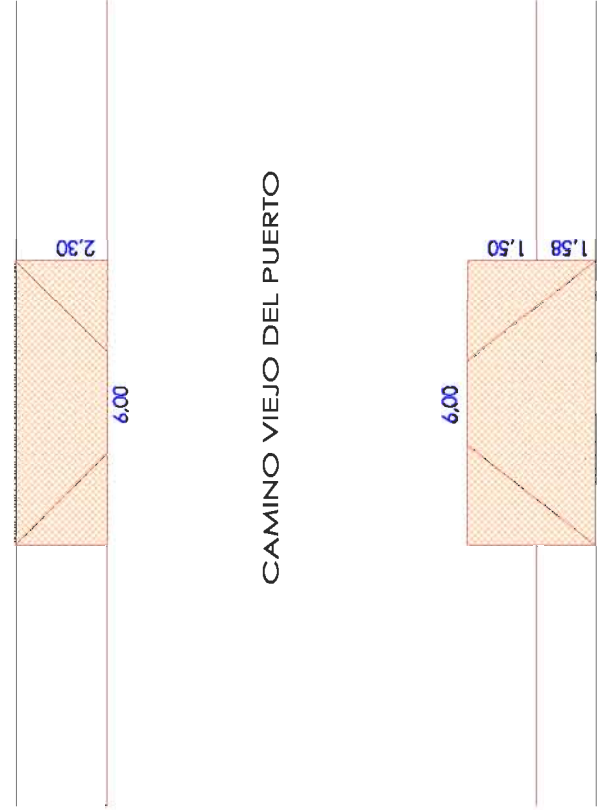


0321 Cº Viejo del Puerto con Infante J Manuel (2)



0321 Cº Viejo del Puerto con Infante J Manuel

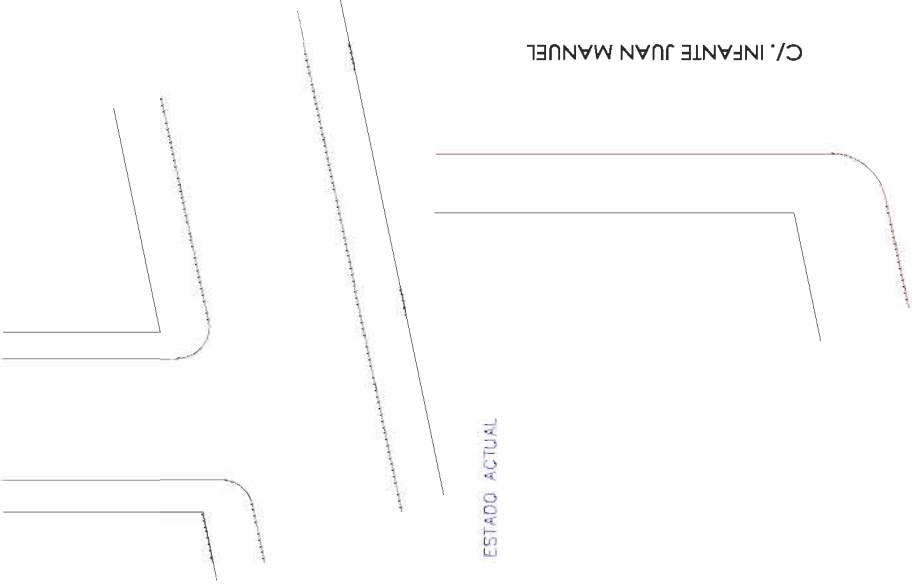

ESTADO ACTUAL

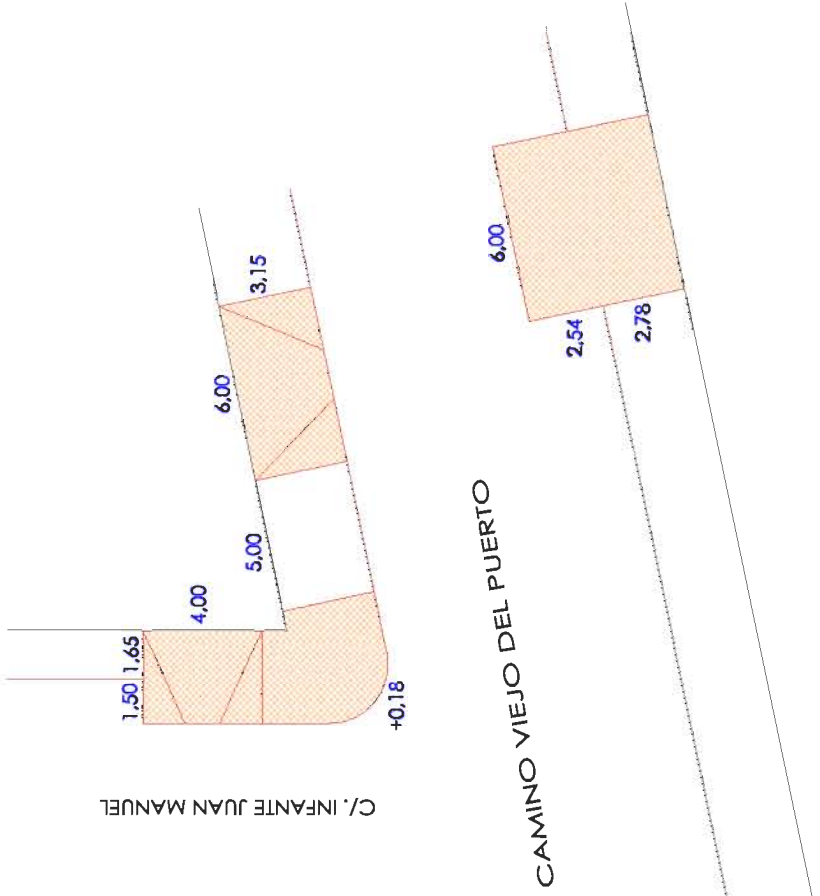

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EDILICIA Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS TÉCNICOS	TÍTULO: 320	SITUACIÓN: CAMINO VIEJO DEL PUERTO	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA (14º FASE)

FECHA: FEBRERO-08


TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO

FECHA: FEBRERO-08

	GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO EDILICIA Y OBRAS PÚBLICAS SERVICIOS TÉCNICOS	TÍTULO: 321	SITUACIÓN: Cº VIEJO DEL PUERTO CON C/. INFANTE JUAN MANUEL	PROYECTO: ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN BARRIO DE LA VIÑA (14º FASE)

FECHA: FEBRERO-08


TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE-ELENA JIMENEZ BAQUERO

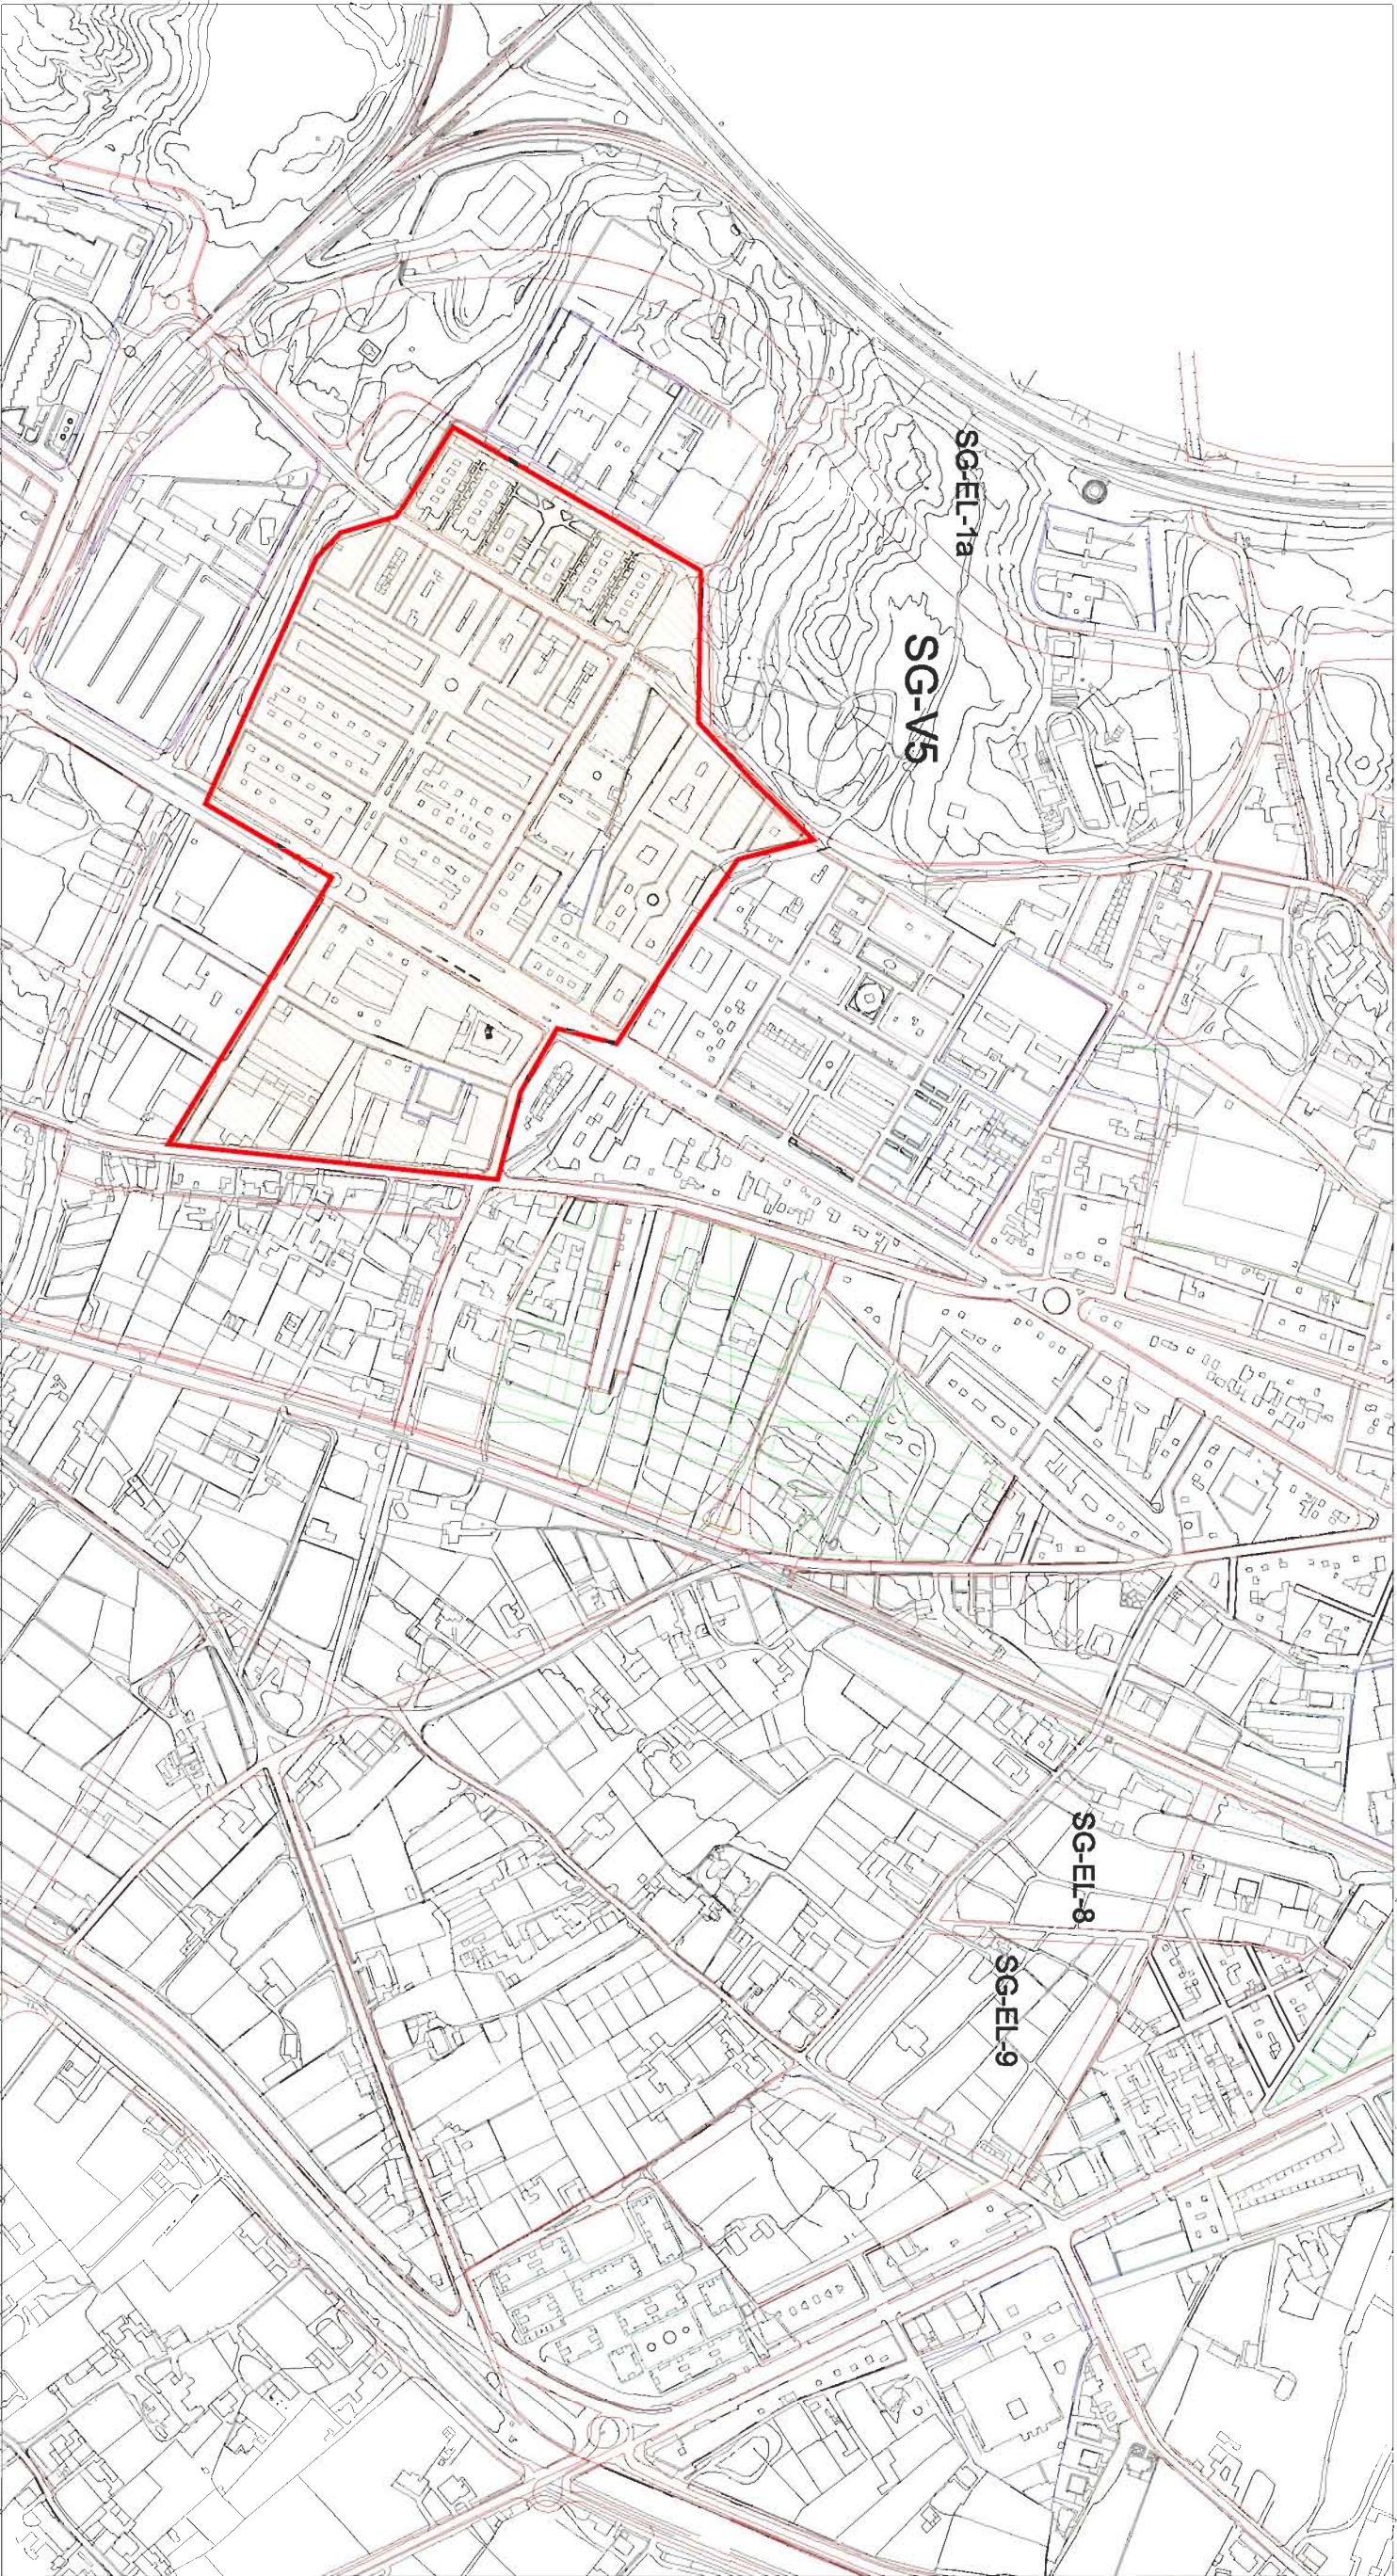

EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LORCA
SERVICIOS TECNICOS

PROYECTO: ELIMINACION DE MIL BARRERAS ARQUITECTONICAS (14ª FASE)
EN BARRIO DE LA VINA

ESCALA: 1 / 5000	DENOMINACION: PLANO DE SITUACION	Dibujado A. LOZOVIA
TECNICOS REDACTORES: LUIS MARTINEZ RECHE APAREJADOR MUNICIPAL	ELENA JIMENEZ BAQUERO INGENIERA TCA. OB. PUB.	Plano 01 Fecha FEBRERO 2.008

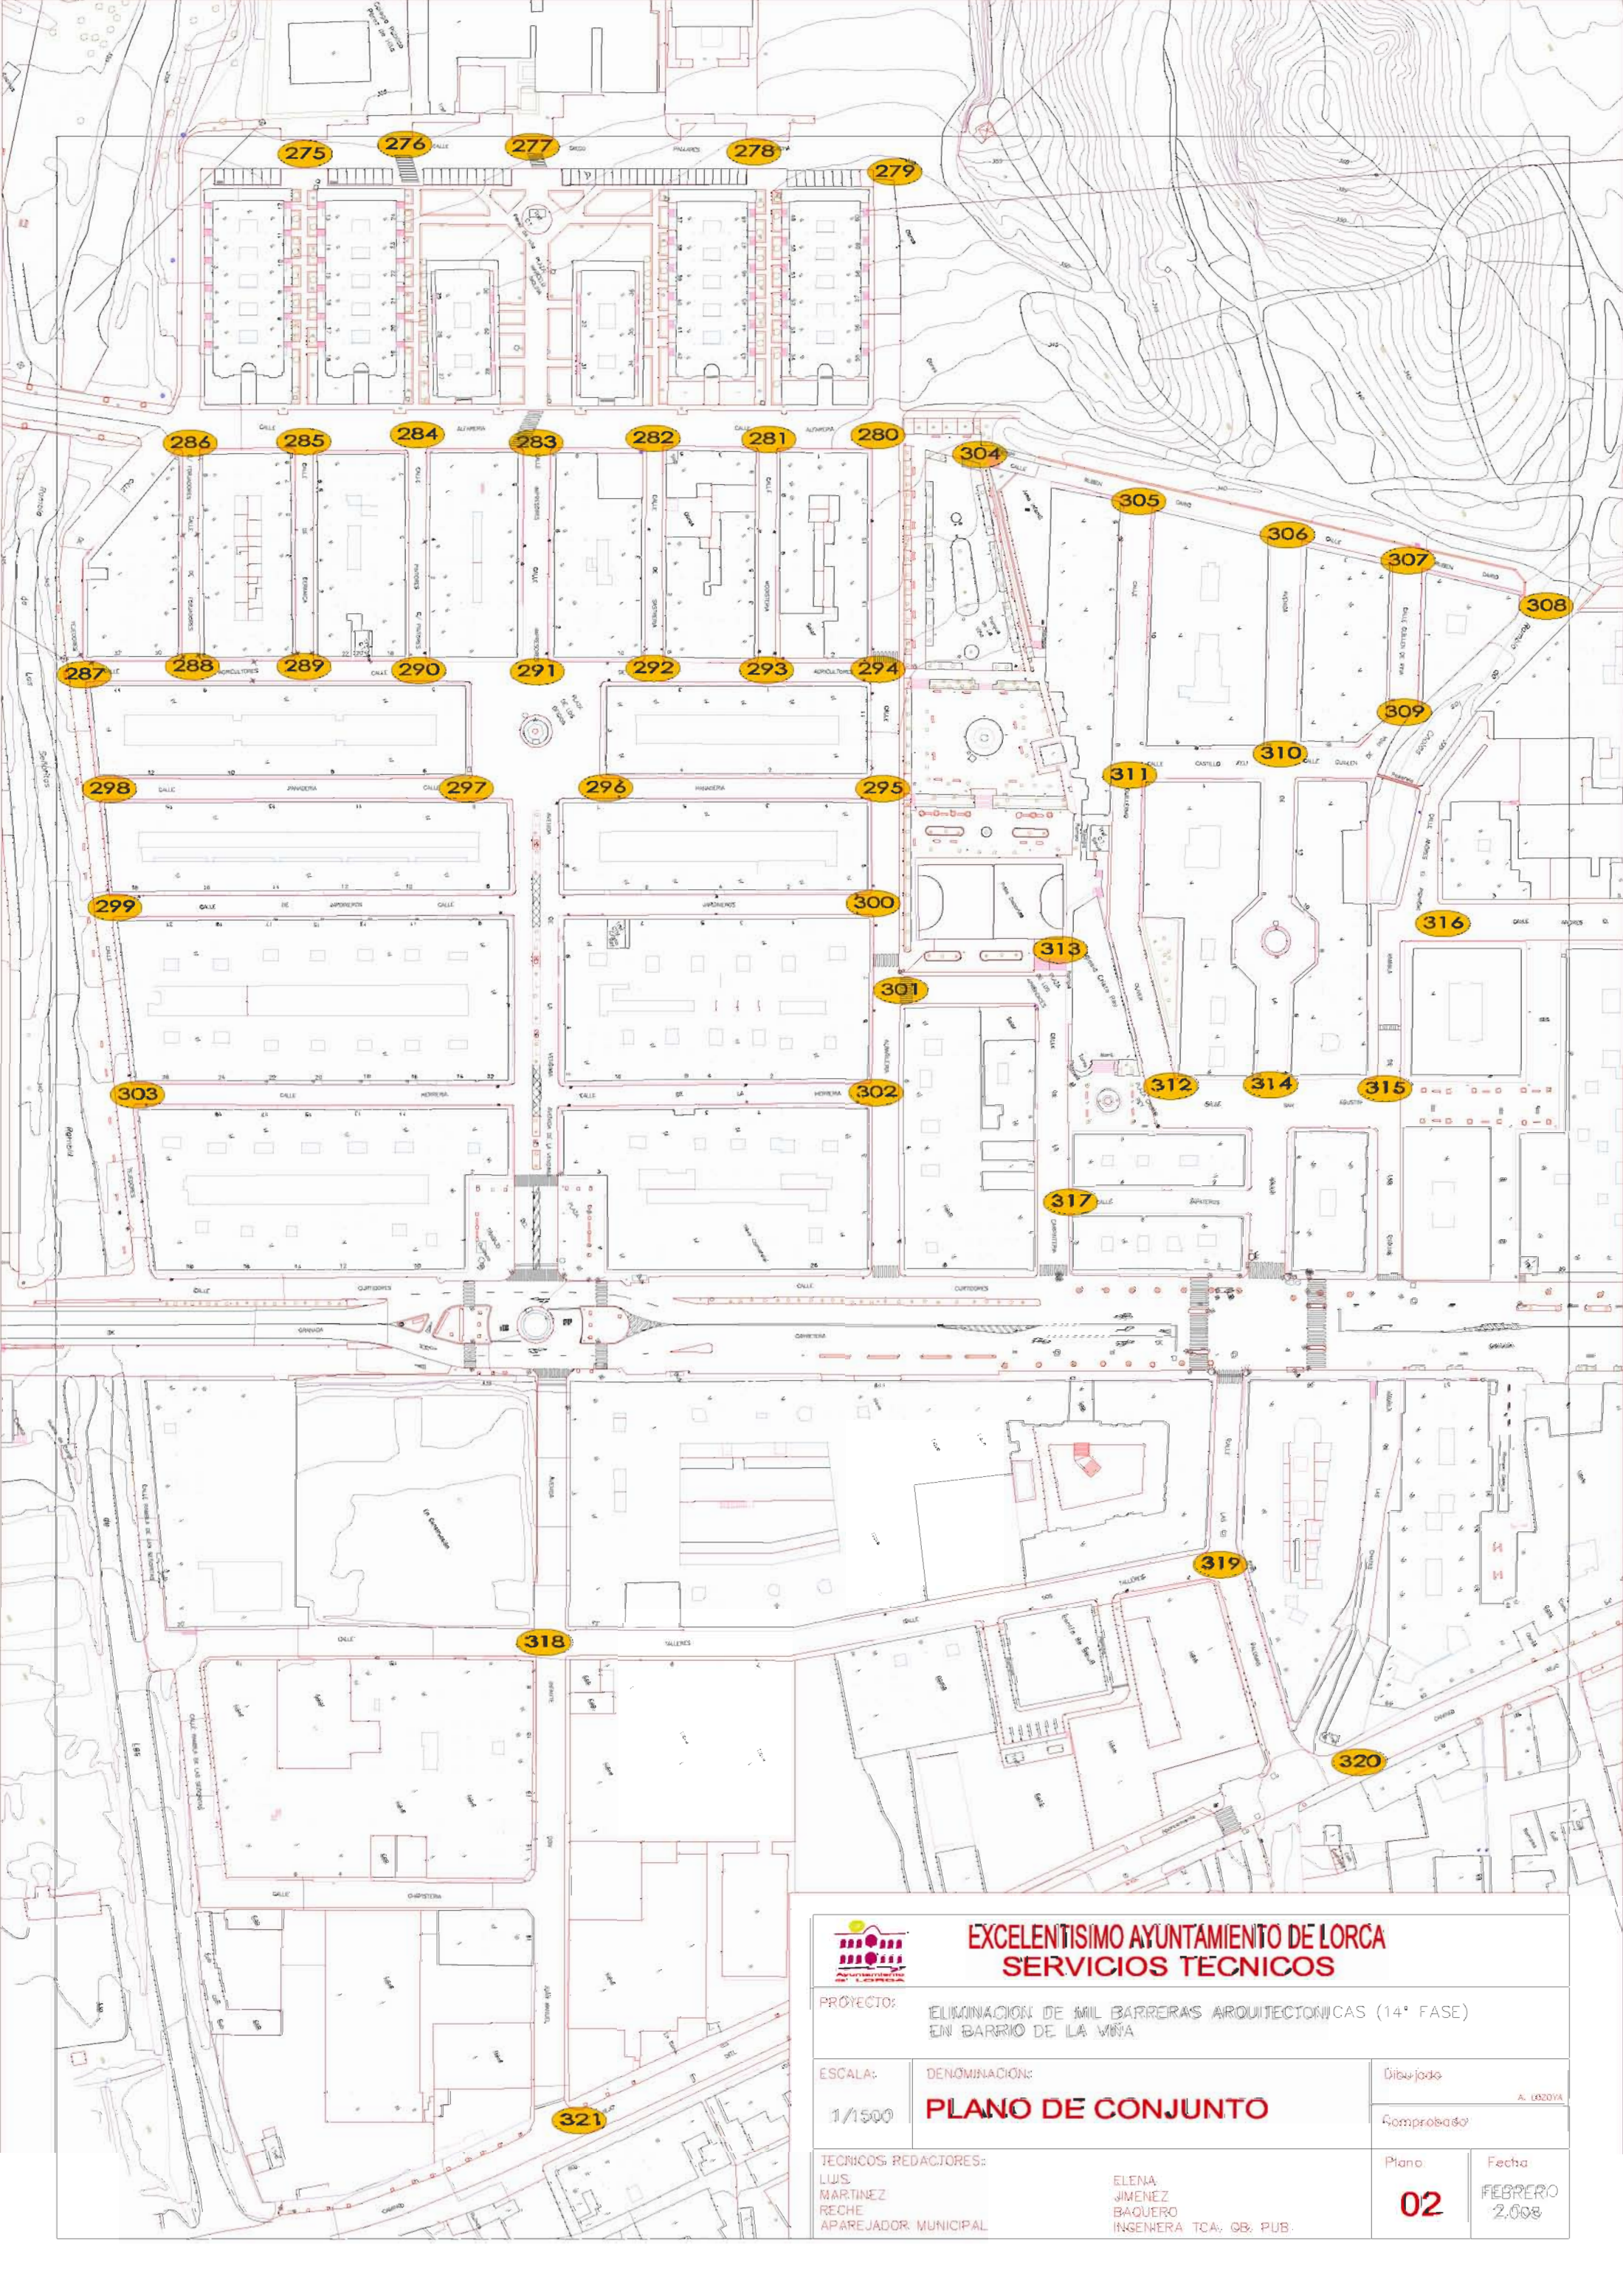



EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE LORCA
SERVICIOS TECNICOS

PROYECTO: ELIMINACION DE MIL BARRERAS ARQUITECTONICAS (14ª FASE)
EN BARRIO DE LA VIÑA

ESCALA: 1/1500

DENOMINACION: **PLANO DE CONJUNTO**

TECNICOS REDACTORES:
LUS. MARTINEZ RECHE
APAREJADOR MUNICIPAL

ELENA JIMENEZ BAQUERO
INGENIERA TCA, CB, PUB.

Dibujado
A. LOZOYA

Comprobado

Plano **02**

Fecha
FEBRERO 2008
